

Technická správa komunikací

3. sešit

II. HOSPODAŘENÍ RO

2. Kapitálové výdaje	81
3. Příjmy	111
4. Hospodářská činnost	111
5. Přehled výběrových řízení	114
6. Vyhodnocení kontrolní činnosti	116

Přílohy: výkaz FIN 2

rozvaha

tabulky z fin.vypořádání

2. Kapitálové výdaje

V tis. Kč	upr.rozpočet	skutečnost	%
§ 2212 6121 MHMP 6130 MHMP	851 911,2 7 577,0	840 639,0 3 082,8	98,6 40,7
2212 6121 SFDI	622 280,0	540 125,8	86,8
2299 6121 MHMP cyklostezky	18 097,0	18 097,8	100,0

3208 Most Zličín – rozšíření Řevnické

termín realizace: 10/2003 – 09/2005

celkové RN akce: 76 851 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: METROSTAV a. s.

projektant: ATELIER PROMIKA, Metroprojekt a. s.

Jednalo se o výškové úpravy ul. Řevnická a Na Radosti, zlepšení vjezdu i výjezdu k Nákupnímu centru Zličín. Byl upraven vlastní tvar křižovatky, komunikace rozšířena a směrově rozdělena. V roce 2005 v rámci stavby byly provedeny stavební úpravy a výstavba SSZ Řevnická – Ringhofferova včetně úpravy dělícího ostrůvku v ul. Řevnická pro přepravu nadměrných nákladů do závodu Siemens.

3217 Systém řízení MSP

termín realizace: 2005

celkové RN akce: 90 000 tis. Kč

Jedná se o soubor jednotlivých SSZ.

K Barrandovu - K Holyni

termín realizace: 06/2005 – 08/2005

celkové RN akce: 22 824 tis. Kč

obstaravatel: -

projektant: AŽD Praha s. r. o.

Jedná se o výstavbu nového světelně signalizačního zařízení na křižovatce K Barrandovu – K Holyni. Účelem výstavby je bezpečnost silničního provozu. V srpnu 2005 bylo uvedeno do zkušebního provozu..

K Barrandovu - Ke Smíchovu

termín realizace: 2006

celkové RN akce: 15 042 tis. Kč

obstaravatel: AŽD Praha s. r. o.

projektant: AŽD Praha s. r. o.

Jedná se o výstavbu nového světelně signalizačního zařízení na křižovatce K Barrandovu - Ke Smíchovu. Účelem výstavby je bezpečnost silničního provozu.

Je požádáno o rozhodnutí o umístění stavby na stavební úpravy , ÚR na SSZ je vydáno.

Předpoklad zahájení v 2006.

Náchodská - Stoliňská

termín realizace: 2006
celkové RN akce: 4 683 tis. Kč
obstaravatel: -
dodavatel: -
projektant: Pragoprojekt a. s.

V roce 2005 zahájena příprava akce. Jedná se o výstavbu signalizovaného přechodu pro chodce včetně směrových změn stávající komunikace ve vztahu k zastávce MHD BUS a k nutnosti jejího posunu. Účelem stavby je zajištění bezpečnosti dětí. Zpracována DÚR a rozeslána ke stanoviskům, předpoklad ÚR je 05/2006.

7970290 – HDŘÚ

RN 2005 - 2006: 8.000 tis.Kč

Dodavatel: Eltodo, SBH

Příprava prací pro rozšíření či modernizaci HDŘÚ.

S ohledem na připravovanou úpravu HDŘÚ práce omezeny.

Předpokládané RN 2005: 2.000 tis. Kč.

Byla vypracována PD vč. strukt. sign. a dat pro Oblast 4. Provedeno doplnění a zprovoznění grafic. výstupů připoj. SSZ, doplnění a nastavení optic. převodníků.

Fakturováno: 1.411.983,-

7970281 - ODRÚ do prostor TAT

RN: 4.000 tis.Kč

Dodavatel: SBH

ODRÚ osazena, probíhá připojování jednotlivých křížovatek

Provedeno doplnění řadičů MTC a jejich připojení na GBR 3, dodávka a rekonstrukce KOK GBR 4-SSZ 8.270.

Fakturováno 1.755.131,-

7970280 - Přemístění TVD na magistrále

RN: 700 tis.Kč

Dodavatel: Eltodo, Janus

Akce realizována, kamera v provozu

Fakturováno: 639 342,-

7970190-SSZ 1.111 Keplerova – Parléřova

Termín realizace: 2005

RN: 2.000 tis.Kč

Dodavatel: Eltodo

Akce realizována, SSZ je ve ZP

Fakturováno v roce 2005: 1.169.490,30- Kč

7970171-SSZ Sokolovská – Zenklova

Termín realizace: 2005 - 2006

RN: 5.000 tis.Kč

Fakturováno v roce 2004 za výměnu řadiče a vynucené úpravy: 1.128.946,- Kč

Projektant: ÚDI

9.6.05 odeslána na ÚDI nesouhlasná stanoviska k DŘ od DOP MHMP a PČR.

V současné době ÚDI zapracovalo připomínky k DŘ.

7970179-SSZ Květnového vítězství – Schulhofova

Termín realizace: 2005

RN: 2.800 tis.Kč

Dodavatel: Eltodo, OSTAV

Projektant: Eltodo

V důsledku rozšíření rozsahu povrchových úprav nárůst nákladů.

Akce realizována, SSZ je ve ZP

Fakturováno: 2.825.161,-

7970178-SSZ 4.423 Na Pankráci - Viktorínova

Termín realizace: 2005

RN: 2.000 tis.Kč

Fakturováno: 1 608 678,- Kč

Dodavatel : AŽD.

Akce realizována a zkolaudována

7970206-SSZ Květnového vítězství-Ke stáčírně

Náklady : 1 603 tis.Kč

Stavba realizována v 2004 - 2005

Realizováno, ZP ukončen , zkolaudováno

Dofakturováno :531 606,- (demont.provizoria a kolaud.podmínky)

7970217-SSZ Bucharova-Pekařská

Náklady: 3 560 tis.Kč

Realizováno v r. 2004,

Dofakturováno :507 295,-(vícepráce a kolaud.podmínky)

V roce 2005 ZP ukončen,zkolaudováno

7970184 - KOK Jeremiášova – Červeňanského

Termín realizace: 2005

RN: 2.000 tis.Kč

Fakturováno: 170.170,- Kč (PD)

1.370.876,- Kč (realizace)

Dofakturováno: 186.604,- Kč (za vícepráce)

Celkem: 1.727.650,- Kč

Dodavatel: Elgo

Ukončeno.

7970207 - Korunovační – Ml. Horákové

Termín realizace: 2005 - 2006

RN 2006: 3.000 tis.Kč

Eltodo ve spolupráci s ÚDI zpracovává dvě varianty řízení proměnných dopravních značek a ovládání požadovaných závor do tunelu.

7970208 - Štefánikův most - LAT

Termín realizace:2005 - 2006

RN: 2.000 tis.Kč

Dopravní řešení vypracovalo ÚDI, 1.6.05 podána žádost o vydání stanovení užití. Proběhlo připomínkové řízení. DŘ bylo dle požadavků upraveno a bylo předáno na DOP MHMP.

7970230 - Průmyslová – Ke Kablu

Termín realizace: 2005

RN: 4.600 tis.Kč

Dodavatel: SBH, ELTODO

V důsledku atypických betonových podkladů v místě stavby a rozšíření zemních prací a VO nárůst nákladů.

Akce realizována, SSZ je ve ZP

Fakturováno: 6.627.706,50

7970235 - Chodovská – výjezd tramvaje

Termín realizace: 2005

RN: 1.000 tis.Kč

Projektant: ÚDI

Bylo realizováno jako přenosné SSZ.Zatím neuvedeno do provozu (nesouhlas PČR).

7970279 - Tabule Podolí

Termín realizace: 2005

RN: 500 tis.Kč

Nebylo realizováno.

7970286 - SSZ Resslova – přechod

RN: 3.500 tis.Kč

Dodavatel: SBH, ELTODO

Realizováno jako přenosné SSZ,dle přísl.SOD cena 1 227 485,-.

Fakturováno: 1.227.485,-

7970287 - Optický okruh TSK

RN 2006: 6.000 tis.Kč

Projektant: Janus

Je zpracována projektová dokumentace.

Fakturováno: 92 820,-

7970288 - Optický kabel v tunelu metra „A“

Termín realizace: 2005

RN: 4.000 tis.Kč

Dodavatel:Janus s.r.o.

Projektant: Meacont s.r.o.

Projektová dokumentace vypracována.: cena 149 940,-

Akce realizována.

Fakturováno: 4.885.076,-

7970289 - Bubenská U Výstaviště

Realizace: 2006

RN: 500 tis.Kč

DIP Marek zpracovává DŘ.

Na TSK v současné době k odsouhlasení návrh ceny PD

7970293 - Korunní – Sázavská

Realizace: 2006

DŘ je vypracováno a v současné době je rozesláno k připomínkování

7970295 - Výpadová – Lahovický most

Realizace: 2006

Podepsána SoD s SBH na ÚR , SP a rel dokum. Termín:30.5.2006

Cena dle SoD 399 245,-

7970296 - Kutnohorská – Dolnoměcholupská

RN: 3.600 tis.Kč

Stavební povolení zajišťuje Zavos – zatím nevydáno.

7970297 - U Krčského nádraží – Vídeňská

Realizace: 2006

RN: 500 tis.Kč

DIS Tomek zapracovává do DŘ připomínky DOP MHMP a PČR SHMP.

Podepsána SoD s Eltodem na ÚR, SP a real.dokum. Termín ÚR 30.1.2006

Počátkem roku 2006 bude realizováno přenosné SSZ.

7970298-Čimická – Libišská přechod –preference MHD

RN: 500 tis. Kč.

Repase řadiče včetně doplnění pro potřeby preference MHD a oživení

Realizováno, fakturováno 422 963,-

7970299 - Naváděcí systém na parkování v kongresovém centru Praha

RN 2005: 2.000 tis. Kč.

Dodavatel: ELTODO

Akce realizována.

Fakturováno: 490.697,-

7970300 – KOK 3.364 -3.374

Koordinační kabel Koněvova-Spojovací x Koněvova-Na Vrcholu

Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována
Fakturováno 475.676,-
7970301 – KOK 3.373 -3.374
Koordinační kabel Koněvova-Na Vápence x Koněvova-Na Vrcholu
Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována
Fakturováno 283.180,-
7970302 – KOK 3.323 -3.319
Oprava trasy Želivského x Nám. J. z Lobkowitz
Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována
Fakturováno 802.857,-
7970303 – KOK Argentinská - Plynární
Oprava trasy SSZ 7.137 Argentinská-Plynární
Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována
Fakturováno 535.500,-
7970304 – Mladoboleslavská - Vrchlabská
Výměna havarovaného řadiče
Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována, DŘ ke stanovisku na DOP.
Fakturováno 1.170.100,-
7970305 – P+R Zličín-výměna propojovacího kabelu
Výměna havarovaného napájecího kabelu značky č. 10
Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována
Fakturováno 292.077,-
7970306 – Opatovská- Chilská
Úprava SSZ a výměna sloupu SSZ
Dodavatel: ELTODO.
Akce realizována
Fakturováno 369.816,-
7970307 – Městský kamerový systém
Integrace MKS s kamerovým systémem TSK, rozšíření a montáž MKS-X. etapa
Dodavatel: Janus
Akce realizována
Fakturováno 1.454.687,-
7970308 – Ohrada-jízda na červenou
Monitorování na křížovatce Želivského-Koněvova
Dodavatel: AŽD, s.r.o.
Akce realizována
Fakturováno 2.330.638,80
7970310 – Systém vážení vozidel na JS
Zajištění pracovní PD, odběrných míst a určení trasy napájení
Dodavatel: ATECH
Akce bude dokončena IQ2006
Fakturováno 119.000,-
7970311 – DIC optimalizace SSZ
Optimalizace SSZ
Dodavatel: VARS Brno a.s.

Akce realizována
Fakturováno 1.236.410,-

3220 Broumarská most a komunikace

Broumarská I. etapa

termín realizace: 12/2004 – 30. 6. 2005

celkové RN akce: 162 996 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: Commatel – Uher s. r. o.

projektant: VinConsult spol. s r. o.

Přeměna komunikace extravidlánového typu s příkopovým odvodněním na komunikaci městského typu s chodníky a novým odvodněním.

V prosinci 2004 byla zahájena rekonstrukce opěrné zdi a části komunikace (0,200 – 0,450 km) s termínem ukončení 06/2005. K 30. 6. 2005 byla akce dokončena a od 1. 7. 2005 puštěna do zkušebního provozu. Proběhlo měření hluku dle požadavku OHS s následným přetěsněním oken jednoho objektu. Termín kolaudace je 30. 6. 2006.

Tato akce je zařazena do programu JPD – 2.

Broumarská II. etapa

termín realizace: 12/2005 – 12/2006

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: sdružení PSVS a DSP

projektant: VIN Consult s. r. o.

vymezení stavby: Rožemberká k přemostění Rokytky

V rámci stavby dojde k přeměně komunikace extravidlánového typu s příkopovým odvodněním na komunikace městského typu s chodníky a novým odvodněním. Dále bude zbudována dešťová usazovací nádrž, další část opěrné zdi a proběhne rekonstrukce mostu přes ČD.

V prosinci 2005 bylo provedeno dílčí předání stavby a stavba zahájena přípravnými pracemi. Zahájení vlastní realizace bude v 03/2006.

Tato akce je zařazena do programu JPD – 2.

3223 Rašínovo nábřeží

termín realizace: 1997 – 2006

celkové RN akce: 371 176 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: SSŽ a. s.

projektant: IK Mařík

Rekonstrukce Rašínova nábřeží je vymezena od rampového sjezdu Mánes až po rampový výjezd před Vyšehradským tunelem v celkové délce 1391 m. Rekonstrukce obsahuje opravu náplavkových zdí, plochy dolního nábřeží včetně nového předláždění komunikace, opravu horní nábřežní zdi a podzemních prostor. Součástí je i výměna zábradlí na horním nábřeží i na sjízdných rampách, obnovení brodu pro koně, rekonstrukce limnigrafu, výstavba pacholat pro kotvení lodí. Rekonstrukce je rozdělena do IV. etap dle naléhavosti oprav. Účelem rekonstrukce je zastavení eroze a postupného chátrání objektu po stoletém plnění funkce s následnou obnovou tak, aby byla zachována památkově historická podstata celého nábřeží s možností následného využití.

II. etapa (od ulice Na Hrobci k sjezdu u Vyšehradského tunelu) - ukončena k 22. 2. 2004

III. etapa (Plavecká - Trojická) – ukončena k 05/2005

IV. etapa (Trojanova ul. – Mánes)

Probíhají práce na IV. etapě.

4345 MÚK - Připojení V. a M. Chuchle

termín realizace: 2004 - 2010

celkové RN akce: 830 223 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: Sdružení Chuchle – PSVS a. s. + SSŽ a. s. závod 4, Sdružení Skanska a. s. – Strabag a. s.

projektant: DIPRO, Metrostav a. s.

Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby:

MÚK I/4 M.Chuchle

Důvodem výstavby bylo odstranění kolizního bodu, který byl místem častých havárií na Strakonické silnici při levém odbočení v prostoru Malé Chuchle. Nová komunikace v délce cca 500 m umožní bezkolizní připojení Malé a Velké Chuchle na Strakonickou silnici. Délka vlastního přemostění nad Strakonickou silnicí je cca 240 m.

Stavební povolení bylo vydáno. Předání staveniště se uskutečnilo 15. 9. 2004 a od 11/2004 probíhaly vlastní stavební práce. Překládky kabelů, realizace základů a pilířů mostního objektu včetně spodní stavby mostu přes ulici Strakonickou. Akce je skončena a předána do užívání od 14. 12. 2005.

Propojení Velké a Malé Chuchle, 1. st.

Jedná se o připojení MÚK na komunikační systém V. Chuchle v délce 600 m. Součástí je i oprava komunikace Bezejmenné v Malé Chuchli. V současné době byla část akce – úsek 1. b stavby a ulice Bezejmenné dána po úspěšné kolaudaci do veřejného provozu od 14. 12. 2005. Tím byla napojena Malá Chuchle na komunikaci Strakonickou. Úsek 1. a stavby bude dokončen po skončení investice PVS, tj. cca v 06/2006 – provede se pouze pokládka obrusné vrstvy. Do provozu však bude dán až po skončení 2. úseku stavby, zatím bude používán jako komunikace pro staveniště dopravu při budování komunikačního propojení Velké a Malé Chuchle.

Propojení V. a M. Chuchle, 2. st.

Jedná se o pokračování 1. stavby s napojením k ul. Dostihové ve Velké Chuchli. Na stavbu je právoplatné územní rozhodnutí. Dále se jedná o rekonstrukci komunikace U Skály včetně přímého napojení na ul. Dostihovou v délce 500 m. Součástí etapy je i oprava mostku v ul. Dostihové a mimoúrovňové křížení s tratí ČD. V současné době je uzavřena SoD s vybraným zhotovitelem, tj. sdružení Skanska – Strabag. Byly vydány stavební povolení i rozhodnutí, proti se však odvolalo „Občanské sdružení pro zdravou Chuchli: v zastoupení JUDr. Kužvarta. Realizace zahájila na ÚR – pouze přeložky telekomunikačních kabelů.

Komunikační propojení v Chuchli přes ČD

Po vyjádření všech účastníků ke studii a po provedení dohod s místními obyvateli byl DÚR zpracován a odevzdán do 15. 11. 2005. Je ve stadiu vyjadřování.

4346 Cyklistické stezky

termín realizace: 2005

celkové RN akce: HMP – 27 800 tis. Kč

obstaravatel: Penco s. r. o.

dodavatel: Lesopol , Boubín, , Eltodo, QUO New Benešov

Jedná se o soubor cyklistických tras na území hl.m. Prahy. Vybudované trasy řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy, která je v současné době realizována na stávajících komunikacích.

Příprava:

Praha 15 – Petrovice
2950006

Příprava akce pozastavena kvůli nevyřízené soudní restituci a zápornému rozhodnutí OŽP MHMP. ÚMC navrhuje řešení v záležitosti restituce. Současně bude ověřena majetkově trasa 2. etapy, která je přijatelná i pro OŽP MHMP. Dne 5. 10. 2005 bylo jednání u starosty MČ Křeslice. Skutečnost je taková, že pozemky od jezu do Křeslic jsou z vlastnických důvodů neprostupné. Problémy s restitucemi trvají i na dalších pozemcích katastru Petrovice. V současné době nelze pokračovat v projektové přípravě.

Troja – Dáblice

2950011

Zhotovitel PPU-Babtie. Studie realizovatelnosti byla projednána 11. 6. 2004 v dokumentační komisi TSK. K pokračování byla doporučena varianta trasy B1. V tomto smyslu připravuje projektant návrh dodatku SoD pro zpracování DUR. GP k 31. 10. 2005 dokončil DUR a zahájil projednávání k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR je v lednu 2006.

Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013

Zhotovitel DIPRO dokončil návrh dokumentace v úrovni DUR. V rámci projednávání DUR vydali negativní stanovisko Policie ČR, OD MČ Praha 1 a DP. Záležitost byla projednána na VV dne 20. 1. 2005 s tím, že bylo navrženo kompromisní řešení trasy v ulici Mariánské hradby. V tomto smyslu bylo nutno rozdělit celou trasu na úseky A, B, C a D. Úsek A – oblast Starého Města, Mánesův a Čechův most včetně Kosárkova nábřeží zůstává kvůli negativním stanoviskům Policie ČR a OD MČ Praha 1 v úrovni studie a rozpracovaného DUR. Úsek B – cesty v Letenských sadech je zpracován ve zjednodušené PD a MČ Praha 7 vydala dne 13. 1. 2005 sdělení, že nemá námitek k provedení udržovacích prací. Na úsek C – od Letenských sadů, lávka přes Chotkovou ulici, Chotkovy sady, Mariánské hradby a Jelení a úsek D – zbývající část trasy k Pohořelci vydala MČ Praha 6 územní rozhodnutí, které v současné době nabývá právní moci. GP zahájil práce na dokumentaci pro SP. V této souvislosti svolá vstupní výrobní výbor počátkem ledna 2006. DSP k projednání bude do 31. 1. 2006.

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017

Zhotovitel je Atelier DUK, uzavřena smlouva o dílo. Dokončenou studii realizovatelnosti předal zhotovitel investoru dne 13. 4. 2004. Akce byla dne 21. 5. 2004 projednána v dokumentační komisi TSK a doporučeno další pokračování přípravy s tím, že budou redukovány investiční náklady. Je uzavřen dodatek SoD na zpracování PD k DÚR. Negativní stanovisko Policie ČR bylo překonáno, bylo nutno akci k územnímu řízení rozdělit na 5 úseků. Řízení je pozastaveno, GP doplňuje podání. Z časového hlediska je předpoklad doplnění podání a vypsání územního řízení do konce ledna 2006.

Freyova – Kyjský rybník

2950018

Zhotovitel A.D.O. předal studii realizovatelnosti doplněnou o připomínky dne 12. 5. 2004. Akce byla projednána v dokumentační komisi TSK dne 26. 3. 2004 a doporučena pro pokračování další fáze. GP dokončil dokumentaci na úrovni DUR a zahájil její projednání s orgány a organizacemi. Od OŽPD MČ Praha 9 přišlo negativní stanovisko k trase cyklistické stezky. Dne 28. 6. 2005 bylo za účasti vedoucího OŽPD MČ Praha 8 konstatováno, že MČ trvá na nové trase po stávajícím drážním náspu od ulice Freyova. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že 1. etapa stezky až po ulici Poděbradská bude v rozpracovanosti DUR zastavena a o získání územního rozhodnutí bude usilováno pouze pro II. etapu stezky (od ul. Poděbradské). U několika pozemků majitelé změnili své rozhodnutí a nesouhlasí s realizací stezky. U části pozemků proběhlo vrácení pozemků od IROP na původní vlastníky, kteří jednoznačně realizaci cyklostezky odmítli. TSK doporučuje ukončení projektové přípravy a celé akce.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020

Zhotovitel KD KONCEPT, uzavřena smlouva o dílo. Zhotovitel dokončil a předal TSK studii realizovatelnosti, která byla dne 22. 10. 2004 projednána v DK TSK a doporučena k dalšímu pokračování v projektové přípravě. Bohužel se nepodařilo dosud uzavřít dodatek k SoD pro zpracování DUR, další jednání s projektantem v této věci se uskutečnilo 29. 6. 2005, kde byly dohodnuty termíny pro uzavření dodatku SoD na zpracování DUR. Termín návrhu DÚR byl k 30.9.2005, dodatek smlouvy však dosud není uzavřen. Reálný termín DUR je tři měsíce po uzavření dodatku smlouvy.

Modřany – most Závodu Míru

2950022

Zhotovitel Atelier DUK, studie realizovatelnosti byla předána investoru dne 13. 4. 2004. Akce byla projednána 21. 5. 2004 v dokumentační komisi TSK. Akce byla doporučena k dalšímu pokračování. Jednání s projektantem se uskutečnilo dne 14. 6. 2004. Byla vybrána varianta vedení cyklostezky mimo zátopovou oblast v délce cca 400m po stávajícím náspu vedle železniční tratě. ÚR nabyla právní moci. Projektant připravuje dodatek SoD na vypracování dokumentace pro SP a pokračuje na jejím dopracování. Předpoklad dokončení návrhu DSP k projednání s orgány je do k 31. 1. 2006.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025

TSK objednal vypracování studie u zhotovitele VIN Consult spol. s r.o. Studie realizovatelnosti byla předána k 31. 12. 2004 a dne 4. 2. 2005 byla projednána na dokumentační komisi TSK. Investor projednal s GP termíny zpracování DUR, GP předloží návrh dodatku SoD na zpracování DUR. Dne 19. 10. 2005 bylo jednání na MČ Zličín s MÚ Chýně, která připravila do fáze DUR jednu ze stezek, a to spojení Sobína s Chýně. Bylo dohodnuto, že územní řízení pro tuto část zajistí MÚ Chýně a pro část stezky postoupí vydané ÚR na TSK, které bude pokračovat ve zpracování DSP a realizaci. ÚR pro tuto část lze očekávat v 1. Q. 2006. GP po dopracování geodetických podkladů zpracuje návrh DUR na zbývající tři části stezky v termínu k 30. 11. 2005. Předpoklad podání žádosti o územní řízení je v únoru 2006.

Cyklistické stezky na území Praha – Nedvězí

2950026

TSK objednal vypracování studie u zhotovitele VIN Consult s. r. o. Zahájení práce na studii realizovatelnosti musí předcházet jednání na MÚ ohledně problému odvodnění celého úseku a vlastnických poměrů. Vzhledem k technickým problémům (odvodnění) a vlastnickým nejasnostem nebude pravděpodobně práce na studii zahájena.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042

Jedná se o náhradní trasu za přerušenou část cyklotrasy 3 v Malé Chuchli. TSK objednala u DIPRO zpracování studie realizovatelnosti s termínem 06/2005. Dne 26. 5. 2005 se uskutečnil další výrobní výbor ze účasti MČ Velká Chuchle a MČ Zbraslav. Studie realizovatelnosti je dokončena, vyskytl se však problém s nevypořádanými vlastnickými vztahy, které nelze řešit jinak, než vyloučením tohoto úseku (cca 0,8km) z projektu. V tomto smyslu byla SR projednána s MČ Praha-Zbraslav. Na základě jednání PS CT z 29. 11. 2005 připravuje TSK výběrové řízení na zpracování DUR a DSP.

Realizace:

Troja – hranice Prahy

2950012

Charakteristika stavby: trasa podél pravého břehu Vltavy od parkoviště pod hlavním vchodem do ZOO směrem K Podhoří, délka 1,4km, šířka 3m, povrch stabilizace Glorit, stezka společná pro chodce a cyklisty. Stavba byla ukončena dne 23. 5. 2005 kladným předáním a převzetím stavby.

Praha 10, Greenway Botič

2950024

Charakteristika stavby: trasa podél levého břehu Botiče mezi ulicemi Petrohradská – U Vršovického nádraží, délka 180m, šířka 3m, povrch asfaltový, společná stezka pro chodce a cyklisty. Akce je dokončena. Přejímací řízení se uskutečnilo 7. 12. 2004 a kolaudační řízení dne 6. 1. 2005. MČ 10 vystavil kolaudační rozhodnutí, které již nabyla právní moci. Akce je ukončena.

Křižovatka Ovenceká

2950027

TSK objednala provedení prací u ELTODO s termínem dokončení 11/2004. OD MHMP vydal v prosinci své připomínky k PD, které byly postoupeny zpracovateli ÚDI Praha k dořešení. ÚDI Praha přepracoval návrh PD dle připomínek OD MHMP, jednání s Policií ČR a OD MHMP se uskutečnilo dne 13. 5. 2005. Došlo k dohodě na definitivní podobě SSZ. ÚDI dopracoval čistopis PD dle této dohody. TSK požádala OD MHMP o stanovení, které OD vydal 12. 7. s připomínkami. TSK provedla výběr zhotovitele (ELTODO), akce je provedena kromě úpravy části VDZ a bude dokončena dle závěrů z jednání dne 22. 11. 2005 (Policie ČR, OD MHMP, TSK) nejpozději do 7. 12. 2005. Akce byla ukončena a převzata.

Cyklotrasa na galerii hotelu Hilton

2950028

Charakteristika stavby: trasa podél pravého břehu Vltavy mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem, využívá upravenou spodní část terasy hotelu Hilton. Délka 225m, šířka 3m, na terase zúžení na 2,5m, povrch asfaltový, na terase plastbeton. Trasa je společná pro chodce a cyklisty. Stavba ukončena a převzata dne 10. 6. 2005, místní šetření ke kolaudaci se uskutečnilo 14. 6. 2005. MČ Praha 8 vydala dne 20. 6. 2005 kolaudační rozhodnutí a nabyla právní moci k 13. 7. 2005. Akce je skončena.

Cyklistická stezka Černý Most – Dolní Počernice

2950041

Charakteristika stavby: stezka propojuje cyklotrasu od Satalic přes sídliště Černý Most směrem na Dolní Počernice a je situována v jihovýchodním okraji sídliště ČM. Délka trasy 357m, povrch převážně asfaltový, částečně zámková dlažba, šířka 3m, stezka je společná pro chodce a cyklisty. Projekt této stezky byl převzat k realizaci od MČ Praha 14 ve fázi vydaného stavebního povolení včetně nabytí právní moci. Byl vybrán zhotovitel, je uzavřena SoD na realizaci s termínem dokončení k 15. 9. 2005. Akce je stavebně dokončena, převzata a MČ Praha 14 vydal kolaudační rozhodnutí, které nabude právní moci ke konci října 2005. Nedodělek SÚ byl odstraněn dne 23. 11. 2005. Akce je skončena.

Cyklistická stezka Praha Řepy

2950044

Charakteristika stavby: stezka propojí stávající cyklotrasu v přírodním terénu (mimo sídliště Řepy) ve směru na Hlubočepy. Jedná se o 1. etapu od ul. U boroviček směrem k ul. Plzeňská, délka 572m, šířka 3m, povrch stabilizace GLORIT. Stezka je společná pro chodce a cyklisty. Projekt této stezky k realizaci byl převzat od MČ Praha 17 ve fázi vydaného stavebního povolení včetně nabytí právní moci. Akce byla odsouhlasena v DK TSK. Investor provedl výběr zhotovitele a v současné době uzavírá SpD na realizaci stavby. Předání staveniště se uskutečnilo 15. 8. 2005 a práce byly zahájeny. Další KD bude 27. 10. 2005. Akce byla dokončena 31. 10. 2005 a dnešního dne proběhla úspěšně kolaudace stavby. MČ Praha 17 vydá v krátkém termínu kolaudační rozhodnutí, nabytí právní moci KR je k 13. 12. 2005.

Cyklistická stezka Sedlecký přívoz, Praha 6

2950043

Charakteristika stavby: stezka propojuje trasu z Podbabky k nově zprovozněnému přívozu v Sedlci, a to od sjezdu z ul. Roztocká podél levého břehu Vltavy, délka 910m, šířka 2,5m, povrch stabilizace GLORIT. Stezka je společná pro chodce a cyklisty. MČ Praha 6 spolu s Povodím Vltavy předaly projektové podklady včetně ohlášení prací na TSK. Dne 20. 5. 2005 byla akce předložena k odsouhlasení na DK. TSK ukončila výběr zhotovitele (LesoPol) a 20. 6.

2005 uzavřela SoD na realizaci. Předání staveniště se uskutečnilo 24. 6. 2005. Kladné přejímací řízení se uskutečnilo 28. 7. 2005. Akce je ukončena.

Pražské kolo – okružní cyklotrasa

2950010

Charakteristika stavby: jedná se pouze o svislé dopravní značení, kterým bude uzavřeno směrové vyznačení cyklotrasy č. 8100 ve Středočeském kraji a okrajích hl. m. Prahy (Klecaný – přívoz - Čakovice, Klánovice, Říčany, Vestec, Vrané n. Vltavou, Zbraslav, Třebotov, Jeneč, Tuchoměřice, Roztoky a Klecaný - přívoz). TSK ukončila výběr zhotovitele a uzavřela SoD na realizaci v průběhu července a srpna 2005. Značky jsou vyrobeny a dokončena je i jejich instalace. Přejímací řízení bylo zahájeno 8. 9. 2005 a ukončeno 20. 9. 2005. Akce je ukončena.

4347 Akce pro BESIP

Náklady akce na rok 2005: 13 990tis. Kč

Kapitálové výdaje byly podle plánu BESIP v částce 13, 990 mil. určeny zejména na stavební úpravy kruhových křižovatek, stavebních zpomalovacích prahů, ostatní požadavky stavebního charakteru a zejména na přisvětlení přechodů pro chodce. Problematický je zejména složitý administrativní proces při získávání stavebních povolení a mnohdy i nejasněností koncepcí a to zejména při stanoviscích k navrženým okružním křižovatkám. Požadavek MHMP na prodloužení času přisvícených přechodů oproti ostatnímu veřejnému osvětlení velmi zkomplikoval a zpomalil výstavbu přisvětlení nových přechodů.. Seznam akcí určených k realizaci v roce 2005 je jako samostatný materiál každé čtvrtletí projednáván v komisi BESIP. V roce 2005 byly zajištěny následující akce :

Čerpání fin.prostředků vKč

Přisvícení přechodů, přepojení stávajících přechodů na PRE, zpracování PD na přisvícení	7 722 089,-
Na větrníku – stavební práh	1 366 253,-
Tlumič LUKO – 5. května	499 800,-
Okružní křižovatka Fr., -Diviše-Hornoměcholupská – jen PD	186 830,-
Okružní křižovatka Dělnická – Osadní – jen PD	218 246,-
Nikoly Vapcarova – stavební práh – jen PD	90 440,-
Tomanova – Kozlova – stavební práh – jen PD	313 822,90
Starokolínská – přechod – jen PD	435,-
Londýnská – Jugoslávská – úprava nároží křižovatky	1 559 596,40
Na Radosti- DoBlatin – studie OK	45 815,-
Únorová – stavební práh	412 786,10
Štěpařská – bezbarierový přechod	85 865,80
Náměstí protifašistických bojovníků – bezbarierový přechod	50 232,30
Měření rychlosti radarem – radarový měřič	228 480,-
Kostelecká – chodník a přechod	483 328,70
Českobrodská – Jahodnice – chodník a přechod + BOCH	311 150,50
Trojská – chodník a přechod	134 211,60
Plk. Mráze – stavební práh – jen PD	92 820,-
Celkem	13 964 202,30

Jedná se o bezpečnostní opatření u škol, na přechodech pro chodce, přípravu a realizaci okružních křižovatek, přisvícení přechodů pro pěší případně další akce související s bezpečností silničního provozu.

- Stavební prahy - v přípravě: Tomanova (2x stavební práh), Plukovníka Mráze, Starokolínská.- zrealizováno: Na Větrníku, Štěpařská

- Kruhové křižovatky - v přípravě: Fr. Diviše – Hornoměcholupská – Novopetrovická
- Dělnická – Osadní – ponechá se stávající průsečná křižovatka -
- Přisvětlení přechodů pro chodce – jedná se o realizaci cca 55 ks přisvětlení přechodů.

4348 Záhytná parkoviště P + R

předpokládaný termín realizace: 2007 - 2010

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: bude vybrán soutěží

P+R Smíchov

Akce TSK byla převzata v 03/2004 od OMI MHMP. TSK projednávala možnost umístění P+R na pozemcích ČD . Na ČD byla poslána žádost o pronájem pozemku

P+R Zličín III

termín realizace 2007 - 2008

celkové RN akce: 350 000 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel:

projektant: Pragoprojekt a. s.

Usnesením RHMP č. 2283 ze dne 21. 12. 2004 HMP nesouhlasí se záměrem objektového parkoviště do doby komplexního a trvalého vyřešení dopravy v daném území. Probíhá příprava stavby.

Veřejné projednání dle EIA proběhlo 24. 5. 2005. V září 2005 bylo vydáno rozhodnutí OŽP. Na základě tohoto rozhodnutí bude svoláno jednání s Radou MHMP, kde budou řešeny zásadní podmínky zadání a poté budou stanoveny priority, zadání řešení dopravní situace území Zličína. PD bude pravděpodobně přepracována.

P+R ČSOB Radlická

termín realizace: 2007

celkové náklady: 267 226 tis. Kč

obstaravatel: Metroprojekt a. s.

dodavatel: není dosud určen

projektant: Metroprojekt a. s.

Stavba nového P+R vyvolána prodejem pozemku s původním P+R novému vlastníkovi. Plocha parkoviště je situována v odrezu svahu přilehlého k jižní straně Radlické ulice mezi křižovatkami s ulicí Výmolovou a Kurvirtovou. Parkoviště je přístupné radiálně dostředným směrem po Radlické ulici s následnou vazbou na uvažovaný průběh Radlické radiály a dále uvažovaným napojením v podobě čtvrtého ramena křižovatky ulic Radlická – Kurvitova. P+R v navrhované poloze rovněž umožňuje pěší vazbu ke stanici metra Radlická.

Vlastní parkoviště bylo řešeno v podobě dopravní plochy se střední pruždnou komunikací š. 6 m a oboustranným kolmým parkovacím stáním š. 5 m. Kapacita parkoviště v navrhované podobě činila 77 stání, z toho 5 pro zdravotně postižené. Terén vyžaduje rozsáhlý zemní práce s vybudováním zárubní zdi. Metroprojekt vyzván k vypracování studie varianty objektového parkoviště s kapacitou 261 stání. Dokumentační komise tuto variantu doporučila. Dne 23. 8. 2005 bylo Radou MHMP rozhodnuto o změně ÚP v dané lokalitě s vymezením P+R v jižním okraji Radlické.

4893 Kolbenova - Kbelská

termín realizace: 06/2004 – 08/2004

celkové RN akce: 16 930 tis. Kč

obstaravatel: OMEGA 99, s. r. o.

dodavatel: SKANSKA DS, a. s.

projektant:

Jednalo se o rozšíření komunikace a vybudování odbočovacího pruhu v šířce 4 m a délce cca 480 m směr centrum (Kbelská – Zálužská). Stavba byla ukončena 30. 8. 2004. V roce 2005 byla provedena sadová úprava (odstranění vad a nedodělků).

5092 Jižní spojka - soubor staveb

termín realizace: 03/1998 – 12/2005

celkové RN akce: 897 566,0 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: BETOSAN spol. s r. o., PSVS a. s., Super – Krete Czech s. r. o.

Jižní spojka je místní komunikace funkční třídy A – rychlostní komunikace. Jedná se o část rychlostního obchvatu spojující dálnici D5 a Barrandovský most s dálnicemi D1 a D11. Má značný dopravní význam a patří do vybrané sítě komunikací v oblasti hl. m. Prahy.

Jedná se o soubor staveb Jižní spojky, která je systematicky opravována dle dílčích úseků včetně mostních objektů. Veškeré etapy byly vždy koordinačně projednány s příslušným odborem MHMP a byly na ně stanoveny termíny. Opravy JS spočívají především ve frézování vozovky a nahradě obrusné projezdne vrstvy komunikace, dále pokud se provádí práce na mostním objektu je do opravy zahrnuta přeizolace mostovky s opravou závěrných zídek a betonových zídek včetně opravy spodní stavby.

V akci souboru staveb Jižní spojka byly realizovány její následující části:

- Jižní spojka – most X 574 – Záběhlická – oprava spodní stavby – 24. etapa

termín realizace: 6. 5. 2005 – 1. 12. 2005

náklady akce: 31 740 716,49 Kč

zhотовitel: BETOSAN spol. s r. o.

- Jižní spojka – odvodnění – 25. etapa

termín realizace: 20. 6. 2005 – 1. 8. 2005

náklady akce: 2 278 298,- Kč

zhотовitel: Herčík a Kříž s. r. o.

- Jižní spojka/I/sever/C + rampa na ul. Modřanskou – 20. + 22. etapa

- oprava pomalého pruhu a vozovky a vrchní stavby mostu na rampě směr ulice Modřanská

termín realizace: 4. 7. 2005 – 21. 8. 2005

zhотовitel: PSVS a. s.

- Jižní spojka VI/sever + jih – úsek u ul. Průběžné – 12. + 13. etapa

- oprava vozovky na JS a nájezdné rampy z ul. Průběžné

termín realizace: 08 – 09/2005

zhотовitel: PSVS a. s.

- Jižní spojka rampy a + b +c – 26. + 27. + 28. etapa

- další část rampy Chodovská – severní větev bude realizována v r. 2006 dle DlR.

termín realizace: 09 – 11/2005

zhотовitel: PSVS a. s.

- Jižní spojka – most X 565 – Vídeňská – oprava spodní stavby – 23. etapa

termín realizace: 09 – 12/2005

náklady akce: 25 782 885,- Kč

zhотовitel: SUPER-KRETE CZECH s. r. o.

5093 Kamýcká – soubor staveb

celkové RN akce: 161 822 tis. Kč

Kamýcká, 2. st. Podchod

termín realizace: 2004-2005

celkové RN akce: 26 233 712,00 Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SSŽ a. s.

projektant: PONTEX s. r. o.

Úrovňový přechod na komunikaci Kamýcká neumožňoval bezpečný přechod pro chodce hlavně v zimním období, kdy auta nejsou schopna před přechodem ve směru do centra zastavit a ve směru opačném se do kopce rozjet. Po dokončené rekonstrukci ulice Kamýcká vznesla MČ Praha 6 požadavek na vyřešení přechodu pěších přes tuto ulici. Toto řešil podchod pro pěší. V rámci podchodu se zřídila zastávka MHD včetně zálivu a přístřešku.

Vydáno SP a vodoprávní rozhodnutí, akce stavebně zahájena v 12/2004 a byla dokončena ve 12/2005. V současné době probíhají kolaudační řízení.

5322 Most přes Berounku (včetně rozštěpu)

termín realizace: 2001 - 2004

celkové RN akce: 614 722 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: Metrostav a. s.

projektant: VPÚ Deco

Stavba je významný dopravní uzel, který bezprostředně navazuje na vyústění a napojení expresního silničního okruhu na komunikaci Strakonickou. Závažným a rozhodujícím důvodem této rekonstrukce byl špatný stav stávající mostní konstrukce. Ukončení celé akce bylo v 11/2004.

Výkupy pozemků zajišťuje mandatář IDS a. s.

V roce 2005 bylo čerpáno pouze na majetkoprávní dokončení akce.

5910 Příprava akcí pro zlepšení infrastruktury MHD

termín realizace: 2004 – 2005

celkové RN akce: 3 134 tis.Kč

obstaravatel: -

dodavatel: viz tabulka

Jedná se o vytváření nových a o stavební úpravy stávajících zastávek, zálivů a přilehlých částí komunikací v rámci programu a v koordinaci s ROPIDem.

č.akce TSK	Název akce	zhotovitel	poznámka
2960023	Náchodská, Sychrov	INPROS	Akce dokončena 10/2005
2960034	Ruzyňská	Autotrak	Realizace v koordinaci s rekonstrukcí ul. Ruzyňské 2006.
2960035	U Matěje	PROGEOK	DSP, žádost ÚR
2960015	K Měcholupům	PROGEOK	DSP
2960004	Polabská, Miškovice	INPROS	Akce dokončena 09/2005
2960039	Ústecká, Počeradská	PROGEOK	Realizace v rámci opravy chodníků v 2006, delimitace
2960040	K Pazderkám		Probíhá realizace
2960041	Nádražní	Pro-Consult	Realizace, 2006
2960043	Špitálská	PROGEOK	DSP
2960044	Ke Klíčovu	PROGEOK	DSP

5967 Michelská

termín realizace: 2005 – 2007

celkové RN 212 931 tis. Kč

dodavatel: není dosud určen

projektant: GREBNER

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace, přeložky sítí, vybudování opěrných zdí a zárubních zdí, rekonstrukci mostu přes Botič.

V současné době probíhá odsouhlasení DSP zpracované firmou GREBNER.

6041 Okružní křižovatka Hornoměcholupská - Milánská

termín realizace: 2006 - 7

celkové RN akce: cca 8 817 152,- Kč

obstaravatel: není dosud určen

dodavatel: není dosud určen

projektant: Ing. Karel Čuřín

Jedná se o výstavbu malé okružní křižovatky v místě stávající provizorní okružní křižovatky.

V současné době je rozeslaná DÚR.

6043 Okružní křižovatka Přátelství – K Netlukám

termín realizace: 05/2005 – 08/2005

celkové RN akce: 19 624 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SSŽ a. s.

projektant: ASTRA – Ing. Čuřín

Jedná se o úpravu atypické průsečné křižovatky na hranici intravilánu MČ Uhříněves. Stávající usporádání křižovatky bylo z dopravního hlediska zcela nevhodné. Návrh a rozsah přestavby na okružní křižovatku vyšel z polohy stávajících paprsků průsečné křižovatky, dopravního zatížení a ekonomické reálnosti stavby.

V rámci stavby bylo provedeno -likvidace zeleně, přeložky inženýrských sítí, nová dešťová kanalizace a přisvícení nových přechodů pro chodce. Práce dle DIR a SP zahájeny 05/ 2005.

Od 28. 8. 2005 v předčasném užívání. Kolaudační řízení přerušeno – nutná dodatečná protihluková opatření (akci č. 744) -výměna oken a přetěsnění na dvou přilehlých objektech. Zhotovitel UG Okna a. s. Termín do 04/2006.

6046 Příprava staveb

termín realizace: 2005

celkové RN akce: HMP – 15 000 tis. Kč

V loňském roce bylo z přípravy čerpáno na akce Michelská, Vyskočilova – 5. května, nájezdová rampa; Liberecká (Vysočanská), Liberecká, Liberecká (Davídkova – Levínská). Jednalo se o přípravu akcí, na které nebyly přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky a bylo nutno pokračovat v přípravě akce. Dále se jednalo o nové akce, které nemají přidělené HMP číslo. Lávka na Baních, Binarova Služská, Bečovská, Anglická, Rohanské nábřeží.

0000 Bečovská

termín realizace: předpoklad 2007

celkové RN akce: cca 85 000 tis. Kč (+ cca 50 mil. Kč na výkupy pozemků)

projektant: Pontex s. r. o.

obstaravatel: D-PLUS

dodavatel: není dosud určen

Rozšíření komunikace. Příprava této stavby je velice složitá. Jedná se o výkupy pozemků, překládky sítí. V současné době DÚR dáno k připomínkám.

0000 Binarova Služská

termín realizace: akce nebude realizována

celkové RN akce:

projektant: Pro-Consult s. r. o.

obstaravatel:-

dodavatel: -

Jednalo se o dvě lokality parkovacích stání v Praze 8 – Kobylisy. Z důvodu kolize s teplovodem, akce zrušena, dosud bylo čerpáno 77 350,- Kč na přípravu.

0000 Lávka Na Baních

termín realizace: předpoklad 2009

celkové RN akce: 20 261 tis. Kč

projektant: Pontex

obstaravatel: -

dodavatel: není dosud určen

Jedná se o výstavbu lávky pro pěší na Strakonické ulici Zbraslav – Baně. V loňském roce bylo čerpáno na přípravu.

0000 Anglická

termín realizace: 2006 - 2007

celkové RN akce: cca 28 000 tis. Kč

obstaravatel: -

projektant: SINPPS - Ing. Volicerová, DIP - Ing. Tomek

dodavatel: není dosud určen

Jedná se o rekonstrukci celého uličního profilu v úseku nám. Míru – Bělehradská včetně rekonstrukce SSZ na obou řízených křižovatkách. Na rok 2006 zatím přiděleno pouze 5 mil. Kč.

0000 Rohanské nábřeží

termín realizace: 2006

celkové RN akce: cca 17 850 tis. Kč

obstaravatel: -

projektant: GREBNER

dodavatel: není dosud určen

Jedná se o rekonstrukci Rohanského nábřeží v úseku od křižovatky Ke Štvanici – ul. U Nádražní lávky. Bude provedena výměna živícího krytu a částečně i výměna celé konstrukce vozovky.

6048 Zajištění zimní služby

Termín realizace : 2005

Celkové RN na rok 2005 : 1800tis. Kč

Byla vystavěna 19. stanice Praha 8 – Čimická z plánovaného počtu 20-ti stanic systému včasného varování, která byla v listopadu 2005 uvedena do testovacího provozu.

6493 Telematické systémy

2910003 – Telematika

RN: 6 000 000,- Kč. Čerpání 4 228 619,- Kč

Popis: Lokalizační tabulky, integrace dat do redakčního systému Dopravně informačního centra, licence mapový podkladů.

Vývoj SW redakč. syst a RSD mod.	fakturováno	1 666 000,-
----------------------------------	-------------	-------------

Plazmový monitor	fakturováno	199 920,-
------------------	-------------	-----------

Distribuce dyn. dopr. informací	fakturováno	578 340,-
---------------------------------	-------------	-----------

Digit. mapa	fakturováno	178 500,-
-------------	-------------	-----------

Příprava číselníku TMC	fakturováno	595 000,-
P+R na D5 – úprava HW + SW	fakturováno	584 601,-
Export dat ze systému VRS	fakturováno	360 808,-
Distribuce dyn. dopr. Informací	fakturováno	29 750,-
Distribuce dyn. dopr. Informací	fakturováno	35 700,-

Dopravně informační centrum

RN: 4 000 000,- Kč. Čerpání 3 827 896,- Kč.		
II.etapa – instalace DIC z I.etapy	fakturováno	57 120,-
Stavební část DIC PD	fakturováno	44 625,-
Provozní řád pro DIC	fakturováno	339 150,-
Testy	fakturováno	416 500,-
Paměť pro server IBM	fakturováno	73 780,-
Vytvoření dat. infrastruktury	fakturováno	2 304 293
Integrace dat pro DIC	fakturováno	592 428,-

6647 Rekonstrukce ul. Českomoravské

celkové RN akce: 847 038 tis. Kč

Akce skončena v roce 2004, nevyřešeny pouze pozemky. V roce 2005 byl ukončen zkušební provoz a stavba byla uvedena do trvalého provozu. V roce 2005 čerpáno pouze na pronájem drážních pozemků (SŽDC).

6834 Roztocká

termín realizace: 03/2006 – 11/2006

celkové RN akce: 60 000 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SKANSKA DS, a. s.

projektant: VIN Consult

Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice Roztocké v úseku Kamýcká – V Rokli. Nová vozovka, chodníky. V rámci akce se budují opěrné zídky, překládají se kabely ČD, Telecomu, a nové VO. V roce 2005 probíhala příprava k vydání stavebního povolení. SP vydáno. Koordinace s OMI a PVS v úseku Roztocká dokončena v roce 2005. V roce 2006 přiděleno pouze 33 895 tis. Kč, potřeba finančních prostředků do výše 60 000 tis. Kč

6925 Libeňský most

termín realizace: 2006 - 2007

celkové RN akce: 1 500 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: není dosud určen

projektant: PRAGOPROJEKT, a. s.

Důvodem návrhu na rekonstrukci byl zjištěný velmi špatný stav mostních konstrukcí, především u hlavního mostu přes Vltavu. V rámci návrhu na opravu se počítá s kompletním snesením všech vodorovných nosních částí všech mostů v úseku ulice Libeňský most a jejich nahradou. Celá trasa bude přebudována s tím, že některé mostní konstrukce budou zrušeny a nahrazeny jinými v jiných místech (inundační most). Celkový šířkový profil bude rozšířen ze stávajících 21 na 26 m. V rámci rekonstrukce bude provedena řada přeložek inženýrských sítí, nová dopravní napojení okolní oblasti, protipovodňová opatření, terénní úpravy a mnoho dalšího. Souběžně se předpokládá rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku – investice DP. Akce rozdělena na 3 stavební etapy, z toho 2 zařazeny do projektů JPD 2.

Je požádáno o vydání ÚR. Předpoklad vydání ÚR v 01/2006.

7113 U Průhonu

termín realizace: 2004 - 2005

celkové RN akce: 18 660 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: STRABAG a. s.

projektant: Progeok

Jedná se o rekonstrukci vozovky (v úseku Osadní – Jankovcova) značně poškozené povodní s velkým množstvím výtluků a nerovností, které jsou způsobeny zejména po pokládce inženýrských sítí. Vozovka i přilehlé chodníky byly poškozeny kořenovými systémy vzrostlých stromů (akátů), které částečně i zasahovaly do profilu komunikace .

V roce 2004 byl z důvodu koordinace s PVS a PP realizován úsek Osadní – Komunardů, který byl dokončen 12/2004.

V roce 2005 byl zrealizován úsek Komunardů – Jankovcova. Akce byla řádně zkolaudována.

7114 Přístavní

termín realizace: 2004 – 2005

celkové RN akce: 26 612 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SKANSKA DS, a. s.

projektant: METROPROJEKT Praha a. s.

Jedná se opravu stávající komunikace v rozsahu Osadní – Jankovcova mimo křižovatky s ulicí Komunardů (není součástí akce) a křižovatky s ulicemi Na Maninách a V háji, které zpracovávají jiné projekční organizace.

Komunikace byla postižena povodněmi v roce 2002 . Byla provedena rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží a oprav přípojek kanalizace, rekonstrukce chodníků. Součástí bylo též nové definitivní dopravní značení.

V roce 2005 byl zrealizován úsek Na Maninách – Osadní. Akce byla řádně zkolaudována.

7116 Křížíkova

termín realizace: 2004 - 2005

celkové RN akce: 193 376 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: Skanska a. s., PSVS a.s., SSŽ a.s.

projektant: Pro -Consult

Důvodem výstavby je rekonstrukce komunikace a chodníků po povodni. Stavba rozdělena na 4. etapy.

Ke Štvanici – Prvního Pluku zahájeno v 09/2004 dokončeno 12/2004. Kolaudační rozhodnutí vydáno.

2. stavba úsek Karlínské náměstí – práce na rekonstrukci vozovek a chodníků včetně sanací a injektáží podloží provedeny v 03-06/2005, nyní předčasné užívání a měření hluků.

3. stavba úsek Thámova – Hybešova - práce na rekonstrukci vozovek a chodníků včetně sanací a injektáží podloží provedeny v 03-06/2005, nyní předčasné užívání a měření hluků.

4. stavba – úsek Prvního pluku – Karlínské nám. – v přípravě, probíhá stavební řízení.

7117 Pobřežní

termín realizace: 10/2004 – 06/2005

celkové RN akce: 15 731 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SKANSKA a. s.

projektant: GREBNER

Důvodem výstavby je rekonstrukce ulice Pobřežní v úseku od ulice Prvního pluku po ulici U nádražní lávky.

V 06/2005 dokončena etapa Vítkova – Prvního Pluku (po rekonstrukci stoky investora PVS).

Nyní předčasné užívání, měření hluků.

7121 Haštalské náměstí

termín realizace: 2006

celkové RN akce: 15 000 tis. Kč

projektant: ASTRA projekt

obstaravatel: není dosud určen

dodavatel: není dosud určen

Jedná se o opravy komunikací Anežská, Řásnovka, Za Haštalem a Haštalská. Bude provedena celková rekonstrukce vozovky a chodníků včetně sanace podloží. Vozovka bude s krytem ze stávající velké dlažby a chodníky budou provedeny z mozaikové dlažby.

V roce 2005 čerpáno na přípravu akce.

7125 Hlávkův most

termín realizace: 2007 – 2008

celkové RN akce: 800 000 tis. Kč

obstaravatel: SUDOP Praha a. s.

dodavatel: není dosud určen

projektant: PUDIS a. s.

Jedná se o dva mostní objekty - klenbový a trámový. Dle návrhu opravy měly být odstrojeny až na nosnou konstrukci, sanovány, přeizolovány, provedou se nové dilatace, opraví se odvodnění a vybudují nové vozovky mostního typu.

Byla vypracována „Studii širších vztahů“ v případě uzávěr mostu a předána na PČR DI ke stanovisku.

Pro nejasnou další koncepci opravy projekční příprava pozastavena.

7296 Štefánikův most

termín realizace: 12/2005 – 08/2006

celkové RN akce: 250 000 tis. Kč

obstaravatel: SUDOP Praha a. s.

dodavatel: PSVS a. s. + SSŽ a. s.

projektant: SUDOP Praha a. s.

Jedná se o dopravně významnou akci. Důvodem této opravy je špatný stav stávající mostní konstrukce. Bude provedeno odstranění příslušenství mostu, vozovkového a izolačního souvrství až na horní povrch nosné konstrukce – mostovky, její sanace a zesílení, vybourání krajních stěnových pilířů a jejich zbudování s lepším konstrukčním uspořádáním, vyřešení detailů zejména kolem mostních závěrů a vstupů do mostu, provedením nové izolace, vozovkového souvrství a tělesa tramvajové trati, výměna svršku mostu včetně přeizolace na obou předmostích

– nábřežních podjezdech, oprava vozovek v nábř. podjezdech – náhrada dlažby živicí, oprava navazujících vozovek na předmostích, oprava kanalizačních řadů v nábřež. podjezdech a na předmostích.

Akce je připravena k realizaci, stavební povolení vydáno 3. 3. 2005, zhotovitel vybrán věřejnou soutěží. Pro rok 2006 nebyly přiděleny finanční prostředky.

7334 Šaldova ul.

termín realizace: 10/2005 – 07/2006

celkové RN akce: 35 135 tis. Kč

obstaravatel: D – Plus a. s.

dodavatel: PSVS a. s.

projektant: Grebner

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace po povodni včetně sanace podloží.

Šaldova 1 – úsek Sokolovská – Křižíkova, realizace 10-12/2005 -- dokončeno, předčasné užívání, nyní měření hluků. Šaldova 2 – realizace 03-07/2006

7338 Nábřeží E. Beneše - opěrné zdi

termín realizace: 2004 - 2006

celkové RN akce: 230 090 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SUPER - KRETE CZECH s. r. o., Navatyp a. s.

Jedná se o rekonstrukci nábřežní zdi v celé délce Nábřeží E. Beneše včetně konzol mezi Čechovým a Štefánikovým mostem včetně opravy vozovky v úseku mezi ul. U železné lávky - U plovárny, rekonstrukce obou podjezdů pod mosty (vozovka i opěrné zdi), rekonstrukce chodníků.

I. etapa – opěrné zdi v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu, ukončeno 2004.

II. etapa - sanace opěrných zdí (Občanská plovárna – U Pichla), zahájeno v 04/2005 s termínem dokončení 10/2005. II. etapa SO 1.1 a 1.5 opěrné zdi (Občanská plovárna – U Pichla) dokončena k 15. 11. 2005 a zkolaudováno 1. 12. 2005.

III. etapa – sanace zdí, vybrán zhotovitel Sdružení NAVATYP – Nábřeží E. Beneše.

V 11/2005 předáno staveniště a zahájeny práce na zdech mikroinjektáží. Dokončení akce v roce 2006.

7559 Alšovo nábřeží

termín realizace: 07/2004 – 09/2005

celkové RN akce: 28 350 tis. Kč

dodavatel: Navatyp a. s.

projektant: Projektový ateliér Šantavý

Jednalo se o statické zajištění a opravu nábřežní zdi a zábradlí v úseku mezi Mánesovým mostem a ul. Na rejdišti, opravu zábradlí v úseku Platnéřská – Mánesův most. Práce dokončeny a předány správci.

7560 Chodníkový program

termín realizace: 2005

celkové RN akce: 12 000 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: jedná se o různé dodavatele dle jednotlivých akcí

Jednalo se o opravy chodníků dle požadavků MČ a s jejich spoluúčastí, finanční prostředky přidělovány na 1 rok.

MČ Praha 1 – Jednalo se o ulice Kozí, Jáchymova, Haštalské náměstí – U Obecního dvora, Křížovnické náměstí, Pařížská z mozaikové dlažby a Keplerova má živičný povrch.. Projektantem je ASTRA projekt, Sinpps. Realizace v 2.pololetí.

MČ Praha 3 – v roce 2005 dosud realizováno: Velehradská 11-15, Velehradská 10-14, Radhošťská 10-14. V současné době je prováděno Slezská 134-140. Ve 43. týdnu bude předáno staveniště na realizaci Přemyslovská 28-34, Vinohradská 143-149.

MČ Praha 5 – Jednalo se o ulice Peškové, nám. 14. října, Preslova, Staropramenná, U Smíchovského hřbitova, oprava schodiště Na Kováčce, Štěpařská. Rádně ukončeno.

MČ Praha 6 (Chomutovská, Na Ořechovce). Chomutovská – dokončeno, zkolaudováno. Na Ořechovce určen režim ÚR, ÚR vydáno, realizace 2005 – koordinace s PVS a PP. Uzavírají se dodatky smluv s ÚMC Praha 6. Na Ořechovce – vydáno ÚR a SP, stavba zahájena v 10/2005 a ve 12/2005 dokončena vozovka, práce přerušeny – klimatické vlivy. Dokončení ve 2. čtvrtletí 2006.

MČ Praha 7 – Milady Horákové – bude provedena výměna živičného krytu za kryt z mozaiky (vjezdy – drobná dlažba) včetně bezbariérových přechodů. Realizace v 2.pololetí. V roce 2005 byly realizovány úseky Oveňská – Kamenická a Fr. Křížka – Veverkova. Realizace dalších úseků bude pokračovat v roce 2006 dle přidělených finančních prostředků.

MČ Praha 7 – Troja ul. Nad Kazankou, severní chodník. Bude provedena výměna živičného krytu za kryt z betonové zámkové dlažby. Realizace v 2.pololetí. V roce 2005 bude realizována část severního chodníku do výše přidělených finančních prostředků. Pokračování opravy chodníku bude v roce 2006 v závislosti na přidělení finančních prostředků.

7561 Chotkova

termín realizace: 06 – 08/2006

celkové RN: 77 901 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: PSVS a. s., Zakládání staveb a. s.

projektant: Metroprojekt a. s. – vozovka

PÚDIS a. s. - galerie

Chotkova ulice je významná městská komunikace, která slouží automobilovému a tramvajovému provozu.

Předmětem stavby byly zajišťovací, rekonstrukční a sanační práce na stávajícím objektu Mostní galerie - Chotkova ul. Rekonstrukce proběhla dle PD a byla 30. 9. 2004 kolaudována MHMP OD.

V kolaudačním rozhodnutí bylo uloženo správci dokončení stavebních úprav na spodní stavbě Galerie s termínem dokončení 12/2005

Po přidělení finančních prostředků v říjnu 2005 byla oprava spodní stavby galerie zahájena a bude dokončena v 2006. O posunu termínu byl informován dopisem Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravy.

7562 Janáčkovo nábřeží

termín realizace: 12. 7. 05 – 04/2006

celkové RN akce: 29, 716. 698,- Kč

obstaravatel: -

dodavatel: ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s.

projektant: HYDROPROJEKT, a. s.

Jedná se o rekonstrukci nábřežní zdi a náplavky, odstranění nánosů v řece u nábřežní zdi mezi mostem Palackého a oplocením areálu loděnice Slávie u Jiráskova mostu. Dále se jedná o opravu poškozeného zatrubnění Motolského potoka. Smlouva s dodavatelem byla prodloužena do

04/2006 z důvodu klimatických podmínek a zaplavení jímky vypouštěním rybníků na Motolském potoce.

7563 Moskevská – Bohdalec

termín realizace: 4/2005 – 11/2005

celkové RN akce: 66 230 tis. Kč

obstaravatel: OMEGA 99, spol. s r. o.

dodavatel: Skanska a. s.

projektant: PONTEX s. r. o.

Jedná se o ocelový mostní objekt se dvěma hlavními ocelovými nosníky a se spodní železobet. mostovkou. Celá konstrukce mostku byla velmi zkorodovaná – docházelo k odpadávání části mostu a tím k ohrožování dopravy ČD pod mostem – havarijní stav. Došlo k sanaci celé konstrukce jak ocelové tak ŽB, nová hydroizolace a odvodnění, výměna ložisek a dilatací. Původní žulová dlažba na mostě byla nahrazena živicí.

Akce v 11/2005 dokončena a zkolaudována.

7564 Na Maninách

termín realizace: 09/2004 - 2006

celkové RN akce: 84 485 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: PSVS a. s.

projektant: PRO – CONSULT - Ing. Vladimír Vosátka

Součástí stavby je rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží, oprava a doplnění uličních vpustí, rekonstrukce chodníků a doplnění vzrostlé zeleně.

V roce 2004 byl vzhledem ke koordinaci s PVS a PP realizován úsek Dělnická – Jateční, který byl po dokončení zkolaudován.

V roce 2005 se zrealizoval úsek Dělnická – U Průhonu a byl zkolaudován.

Z důvodu nedofinancování nebyl zrealizován úsek U Průhonu – U Uranie.

7565 Pobřežní III. - komunikace

termín přípravy: 2005 – a dále

celkové RN akce: 836 700 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: není dosud určen

projektant: PUDIS a. s.

Jedná se o výstavbu nové čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace o délce cca 565m v úseku Šaldova - Za Invalidovnou. Navazuje na nedokončený úsek stavby "Pobřežní II" u Šaldovy ulice. Účelem výstavby je prodloužení započatých staveb Pobřežní 1 a Pobřežní 2 o další úsek, kterým se posune provizorní napojení na Sokolovskou do prostoru mimo dnešní obytnou zástavbu. V celém úseku rovnoběžně Sokolovské ulice dojde k odlehčení a zklidnění automobilové dopravy. Vydáno ÚR na obě etapy, pokračuje příprava k vydání stavebního povolení. Akce je zařazena do projektů JPD 2.

7567 Vyskočilova – 5. května, nájezdová rampa

termín realizace: 2007

celkové RN akce: 70 000 tis. Kč

obstaravatel: DIPO s. r. o.

dodavatel: není dosud určen

projektant: A. D. O.

Jednosměrná nájezdová dvoupruhová rampa z ul. Vyskočilova na ul. 5. května Tato rampa má zlepšit dopravní obslužnost daného území. K povolení stavby je navrhována ochranná bariéra výšky 8 m, a to u nájezdové rampy Vyskočilova i sjízdné rampy Michelské. Obě tyto rampy spolu úzce souvisí. Pro DÚR bude zpracována PD včetně architektonických a technických řešení a vizualizace s pohybovou animací. V loňském roce bylo čerpáno na přípravu akce.

7568 Za Elektrárnu – most V 5

termín realizace: 07/ 2005 – 05/2006

celkové RN akce: 36 122 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: SMP Construction

projektant: PONTEX s. r. o.

Důvodem výstavby byla rekonstrukce mostu (spojnice mezi Trójou a Stromovkou). Po povodních v roce 2002 došlo k další destrukci mostu a bylo nutné most přes plavební kanál na Císařský ostrov obnovit.

V současné době je předán most do předčasného užívání. Ukončení celé stavby do 31. 5. 2006.

7785 Pomořanská - parkovací stání

termín realizace: 08/2005

celkové RN akce: 1 300 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: Inpros Praha v. o. s.

Jednalo se o výstavbu parkovacích stání ve dvou lokalitách podél komunikace Pomořanská. Městská část Praha 8 poskytla finanční prostředky výši 1 235 tis. Kč. Stavba dokončena 11/2005.

7876 SSZ na křiž. Českobrod. x Mladých Běchovic

termín realizace: 2004 – 2005

Celkové RN: 3.500 tis.Kč

Náklady 2004: 1 189 tis.Kč 2005: 572 577,- Kč

zhotovitel provizorní SSZ: AŽD DAST Praha.

V roce 2004 byla postavena provizorní SSZ s tím, že bude v roce 2005 po získání nezbytných povolení zahájena realizace definitivní SSZ. V zájmu zajištění bezpečnosti provozu a chodců v této oblasti, byla výstavba SSZ řešena formou provizoria. Problémy s majitelkou přilehlé nemovitosti, vyřešeno. Realizace definitivní SSZ počátkem r.2006.

Předpokládané náklady na definitivní SSZ: 2.000 tis. Kč.

8001 Sokolovská (Balabenka – Na Břehu)

termín realizace: 1. 6. 2005 – 30. 9. 2005

celkové RN: 120 000 tis. Kč

obstaravatel: IDS a. s.

dodavatel: SSŽ a. s.

projektant: Metroprojekt a. s.

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice Sokolovská v úseku mezi ul. Balabenka – Na Břehu. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky (výměna dlažby za živici), rekonstrukce chodníků, zeleně. V souběhu probíhala rekonstrukce TT – DP a kanalizace – PVS.

Akce byla dokončena, předána správci a zprovozněna.

Akce je zařazena do programu JPD 2.

8005 Petrská - regenerace oblasti

termín realizace: 12/2004 – 09/2005

celkové RN: 1. etapa 22 400 tis. Kč

dodavatel: INPROS Praha v. o. s.

projektant: Ing. arch. Sedlák

Regenerace lokality Petrská obsahuje úsek Samcova (Biskupská) až Helmova. Jedná se o opravu vozovky, chodníků, úpravu parkovacích stání, úpravu zeleně včetně dosadby a slavnostního osvětlení kostela Sv. Petra. Akce zkolaudována.

Dále je akce rozdělena do následujících etap:

Petrská II/A – Helmova – Stárkova/Těšnov

Kompletní výměna konstrukcí vozovky a chodníků včetně úpravy zemní pláně a sanace kaveren.

Zřízení nových vpuští a rekonstrukce stávajících.

Termín realizace: r. 2006

projektant: Pragoprojekt a. s.

Petrská II/B – Samcova – Petrké nám.

Kompletní výměna konstrukcí vozovky a chodníků včetně úpravy zemní pláně, sanace kaveren.

Výšková rektifikace povrchových znaků. Výměna sloupů VO za historický typ, včetně pokládky nových kabelů.

Stavba zahájena v 11/2005 , z klimatických důvodů přerušena a bude dokončena v 2006.

8053 SSZ Průmyslová – Teplárenská

7970236

Termín realizace: 2005

RN: 5.000 tis.Kč

Dodavatel: MERCATOR

Akce realizována, SSZ je ve ZP

Fakturováno: 5.987.763,90

8105 U Libeňského pivovaru

termín realizace: 03/2006 – 11/2006

celkové RN akce: 33 500 tis. Kč

obstaravatel: -

dodavatel: není dosud určen

projektant: Pragoprojekt a. s.

Návrh rekonstrukce komunikace respektuje stávající směrové poměry. Dojde k výměně celé konstrukce vozovky a chodníků. Po odkrytí konstrukce vozovky se předpokládá sanace podloží. Vozovka je navržena s živčním krytem, chodníky a chodníkové přejezdy s parkovacím stáním jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby.

Stavební povolení vydáno. V roce 2005 čerpáno na přípravu akce.

8106 Vltavská

termín realizace: 07 – 08/2006

celkové náklady: 18 334 tis. Kč

dodavatel: není dosud určen

projektant: Metroprojekt a. s.

Projekt pro stavební povolení řeší rekonstrukci vozovky a chodníku v ulici Vltavská v Praze 5 v úseku mezi křižovatkami Nádražní a Hořejší nábřeží, včetně křižovatky v ulici Svornosti.

Jedná se o dopravně velmi zatíženou komunikaci, která je významnou součástí městské komunikační sítě v Praze. Stavební povolení vydáno, nabyla právní moci.
Akce přesunuta do roku 2006 z důvodu nepřidělení finančních prostředků.

8108 U Sluncové

termín realizace: 2006 - 2007

celkové náklady: 19 000 tis. Kč

projektant: Pragoprojekt a. s.

dodavatel: není dosud určen

Rekonstrukce komunikace v úseku Pod Plynjem – Za Invalidovnou. V roce 2005 proběhlo územní a stavební řízení, realizace z důvodu nepřidělení finančních prostředků přesunuta do 2006 – 2007.

8110 Malešická , rekonstrukce komunikace

termín realizace: 2006

celkové RN akce: 58 000 tis.Kč

projektant: etapa I. – SINPPS, etapa II. – Novák & Partner

obstaravatel: etapa I. – SINPPS, etapa II. – Novák & Partner

dodavatel: není dosud určen

Jedná se o rekonstrukci komunikace a doplnění oboustranných chodníků podle vozovky v celém úseku. Stava je rozdělena s ohledem na koordinaci s investory na 2 etapy.

Z důvodu nepřidělení finančních prostředků v loňském roce čerpáno z přípravy č. 6046.

8111 Pražská – Švehlova

celkové RN akce: 17 000 tis.Kč

projektant: PK FLORA

obstaravatel: OMEGA 99 spol. s r. o.

dodavatel: není dosud určen

Příprava akce. Výstavba odbočovacího pruhu a rekonstrukce přilehlé části vozovky u křižovatky v délce cca 110 m, vč. úpravy nivelety komunikace, přeložek inž. sítí a rekonstrukci odvodnění.

Z důvodu nepřidělení finančních prostředků v loňském roce čerpáno z přípravy č. 6046.

8113 Bránická - odstavné parkoviště

termín realizace:

celkové RN akce: 1 500 tis.Kč

projektant: Sinnps

obstaravatel:-

dodavatel:není dosud určen

Jedná se o vážní parkoviště pro nákladní vozidla přilehlé k Bránické ulici s plochou 12 200 m².

Denní kapacita vážení 32 vozidel.

V 1. pololetí roku 2005 bylo čerpáno na projektovou dokumentaci. Stavba připravena k výběru zhotovitele a následně k realizaci.

Z důvodu nepřidělení finančních prostředků v loňském roce čerpáno z přípravy č. 6046.

8500 Rek. povrchu propoj. Ramp a zábradlí Barrandovského mostu

termín realizace: 2005

celkové RN akce: 45 078,5 tis. Kč

obstaravatel:-

dodavatel: Skanska DS a. s., Sangreen s. r. o.

projektant: TOP CON spol. s r. o.

V 2005 se realizovaly následující etapy:

1. etapa – sjezd z mostu směr Barrandov včetně úseku Strakonické

dodavatel: Skanska DS, a. s.

- úsek sjezd z mostu směr Barrandov

termín realizace: 5. 8. 2005 – 7. 8. 2005

12. 8. 2005 – 14. 8. 2005

0,00 – 0,170:

fréza 120 mm s následnou živěčnou náhradou ABVH MI v tl. 80 mm a AKMS MI v tl. 40 mm i celkové ploše 1414 m². Trhliny podkladu ošetřeny DP 115 a další práce jsou provedeny dle výkazu výměr.

0,170 – KÚ:

v tomto úseku provedena pouze oprava lokálních výtluků a trhlin asfaltového krytu v úseku 0,170 – 0,200 je před opravou výtluků provedeno strhnutí materálu vyhrnutého ze stopy vozidel frézou. Oprava vozovky je realizována po jízdních pruzích a je provedena výměna poškozených obrubníků, vyčištění rigolů vč. vpustí atd. dle výkazu výměr.

- úsek sjezd úsek na Strakonické

termín realizace: 19. 8. 2005 – 21. 8. 2005

26. 8. 2005 – 28. 8. 2005

V celé ploše opravovaného úseku byla provedena fréza v tl. 100 mm. Následně provedeno ruční dobourání zbytků živice s opravou reflexních trhlin dle TP 115. Po opravě trhlin a očištění podkladu provedena vyrovnávka včetně spoj. postříků s náhradou živic ABVH IM v tl. 60 mm a LAH MI v tl. 40 mm o celkové poše 1 143 m². Délka komunikace 100 bm. Krajnice (dopravní stín) je opravena regeneračním postříkem – plocha 247 m². Před postříkem provedeno zbrošení stávajícího VDZ s lokání opravou povrchu komunikace, hrany styku nové a staré vrstvy jsou sežíznuty, napojení provedeno nalitím hrany pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou. Pracovní spáry jsou profrézovány a též zality modif. zálivkovou hmotou. Zároveň byla provedena výšková úprava kanál. poklopů vč. výškové úpravy a vyčištění těchto vpustí.

2. etapa – sjezd na most Barrandov, rampa X 38

termín realizace: 30. 9. 05 – 2. 10. 05 I. etapa

7. 10. 05 – 9. 10. 05 II. etapa

dodavatel: Skanska DS a. s.

- v úseku sjezd na most Barrandov

V předmostí: fréza v tl. 100 mm, trhliny opraveny dle TP 115, je proveden infiltrační postřík s následnou výměnou ABVH MI v tl. 60 mm, spojovací postřík a AKMS MI v tl. 40 mm včetně podrcení.

Most: provedeny sondy na ověření skutečného stavu, fréza provedena po vrstvách, infiltrační postřík s živěčnou náhradou ABVH MI v tl. 60 mm s vyrovnávkou, spojovací postřík a AKMS MI v tl. 40 mm. Podél kovových dilatecí je proveden proužek z EMZ v šíři 100 mm. Plocha vozovky 1 597 m², délka 238 bm včetně provedení regeneračního postříku 528 m². Dále provedeny práce dle výkazu výměr (VDZ, vyčištění a výšková úprava ul. vpustí, vyčištění mostních odvodňovačů, lokální oprava svodidel a obrub a obnova detekčních snyček.).

3. etapa – k Barrandovu – nájezd na Strakonickou X 42

termín realizace: 12. 10. 05 – 14. 10. 05 I. etapa

15. 10. 05 – 18. 10. 05 II. etapa

dodavatel: Skanska DS a. s.

úsek - K Barrandovu nájezd na Strakonickou

0,00 – 0, 240 most

Fréza stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm včetně odstranění zbytkových slupiček a ručního dobourání. Trhliny ošetřeny dle TP 115, následně je proveden infiltrační postřik, a obrusná vrstva z AKMS MI v tl. 45 mm + vyrovnávka + podrcení. Podél kovové dilatace je proveden proužek EMZ šířky 100 mm. Podpovrchové dilatace jsou proříznuty a vyplněny pružnou modifikovanou hmotou.

0,240 – 0,336 vozovka mimo most

Provedeno odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm včetně odstranění zbytkových slupiček a ručního dobourání. Trhliny ošetřeny dle TP 115, po očištění proveden infiltrační postřik s následným položením obrusu LAH MI v tl. 40 mm s vyrovnávkou a podrcením. Pokládka provedena strojně finišerem s automatickou nivelačí. Ošetření styčných a pracovních spar obrusné vrstvy provedeno profrézováním komůrky se zalitím pružné modifikované zálivkové hmoty. Součástí dodávky je provedení VDZ, výšková úprava ul. vpustí včetně proplachů, výšková úprava kanalizačních poklopů, lokální oprava pásnic svodidel, obnova detekčních smyček, real. DIO a další práce dle výkazu výměr. Plocha komunikace z LAH MI 835 m², plocha AKMS MI 1 889 m².

4. etapa – oprava zábradlí Barrandovského mostu včetně nájezdů

termín realizace: 7. 7. 2005 – 2006

dodavatel: Sangreen s . r. o.

projektant: TOP CON spol. s r. o.

Jedná se o opravu zábradlí a sanace svodidlových zídek, doplnění zabezpečovacího zařízení. Práce pokračují a budou pokračovat i v roce 2006 opravou zábradlí a zábradelních zídek na protivodní a povodní straně mostní konstrukce. Z toho důvodu byl také požadován převod finančních prostředků na rok 2006

8514 Dodávka a instalace označníků TAXI

termín realizace : 08/2005

Celkové RN : 1 732 tis. Kč

Zhotovitel : Eltodo dopravní systémy s.r.o

Označníky taxi byly realizovány na základě usnesení Rady zastupitelstva hl.m. Prahy č.0529 ze dne 3.5.2005. Celkem bylo osazeno 60 ks na vybraných stanovištích taxi dle seznamu vypracovaného OD MHMP. Označníky byly aktivovány a předány do správy středisku 660.

8534 Autobusová zastávka Hlubočepy

celkové náklady akce : 300 tis. Kč

termín realizace : 2005

Byl vybudován nový nástupní ostrůvek s přístřeškem uvnitř bývalé konečné tramvaje v Hlubočepích pro zajištění nově zřízené linky autobusu do oblasti Žvahov Praze 5.

8565 Rek. Liberecká Cínovecká z centra

termín realizace: 10. 9. 2005 – 30. 9. 2005

celkové RN akce: 30 000 tis. Kč

dodavatel: PSVS a. s.

projektant: PSVS a.s.

- v úseku Kbelská – sjezd Březiněves z centra

Jednalo se o frézování asfaltových vrstev v tl. 35 mm o ploše 208 m² a v tl. 110 mm o ploše 18 905 m². Náhrada živících vrstev ABVH MI v tl. 75 mm o ploše 18 905 m² a pokládku finišerem LAH MI s podrcením v tl. 35 mm o ploše 19 065 m². Další práce specifikované dle

výkazu výměr (bourání, řezání, spoj. postřiky, těsnění spar zálivkou včetně úprav, úprava dilatečních spar, doplnění směr. sloupků, úprava ul. vpusť a znaků IS, realizace DIO). VDZ je součástí souvislé údržby.

Akce rádně ukončena.

8604 Záhřebská

termín realizace: 2004 - 2005

celkové RN akce: 5 186 tis. Kč

dodavatel: INPROS Praha v. o. s.

projektant: SINPPS – Ing. Volicerová

V roce 2005 byla z provozní akce Záhřebská část (SO Ostrůvek a SO Fontána) převedena do investic. V současné době se provádějí postupné kroky k převodu ostrůvku s fontánou a sochami do správy majetku Městské části Prahy 2.

8605 Liberecká (úsek Kbelská-Vysočanská)

termín realizace: 23. 11. 2005 – 6. 12. 2005

celkové RN akce: 10 986,1 tis. Kč

dodavatel: Skanska DS, a. s.

projektant: PSVS a.s.

- v úseku Kbelská – Vysočanská do centra

Jednalo se o frézování v tl. 100 mm o ploše 6 029 m² s náhradou živících vrstev ABVH MI v tl. 65 mm včetně vyrovnávky a LAH MI v tl. 35 mm + podrcení. Pokládka obrusné vrstvy provedena strojně finišerem s automatickou příčnou a podélnou nivelačí.

Akce rádně ukončena.

8606 Liberecká (Davídkova – rampa Levinská)

termín realizace: 10. 11. 2005 – 27. 11. 2005

celkové RN akce: v roce 2005 vyčerpáno 29 630 594,30 Kč (včetně pozastávky)

dodavatel: Skanska DS a. s.

projektant: PSVS a.s.

- v úseku Davídkova – rampa Levinská z centra

Jednalo se o frézování o ploše 16 477 m², náhrada živících vrstev ABVH MI v tl. 60 mm včetně vyrovnávky a LAH MI v tl. 40 mm včetně podrcení a přetažení krajnic s LAH MI o tl. 40 mm na ploše 985 m². Pokládka obrusné vrstvy byla provedena finišerem s automatickou příčnou a podélnou nivelačí.

Akce rádně ukončena.

8607 Rozvadovská spojka(úsek Řevnická)

termín realizace: 11/2005 (18 dní)

celkové RN akce: 34 747 tis. Kč

dodavatel: PSVS a. s.

projektant: PSVS a. s.

- v úseku Řevnická – hranice Prahy z centra

Délka komunikace je 1793 bm, šířka 11 – 12,5 m, plocha 20 762 m². Bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 100 mm, na mostech tl. 80 mm s ručním dobouráním. Ošetření stávajících trhlin je provedeno dle TP 115. Staničení 0,00015 – 1,215 a 1,428 – 1,793 mimo most provedeno z ABVH MI v tl. 60 mm a LAH MI v tl. 45 mm a AKMS MI v tl. 35 mm s podrcením. U krajích kovových dilatací je proveden proužek EMZ šíře 10 cm. Ve staničení 1,255 – 1,321 proveden obrus z AKMS MI v tl. 60 mm v AKMS MI v tl. 40 mm s podrcením. Pokládka provedena strojně finišerem s automatickou příčnou a podélnou nivelačí. Součástí dodávky je realizace VDZ. Akce rádně ukončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP za období 12/2005 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava

Dobor / organizace	Cílo akce	Kapitálové výdaje	Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)				% plnění Sč k RU	Zbývá požadavek
				Náklady akce	Profin. celkem	RS rok 2005	RU	Poukázána inv.dotace	Skutečné čerpání		
DOP-TECH.SPRÁV3206	Soubor staveb Podbabská - Roztoč	504 633,68	492 912,68	0,00	0,00			1.1.-31.12.2005	1.1.-31.12.2005	0,00	***
DOP-TECH.SPRÁV3208	Most Zličín - rozšíření Řevnické	314 074,27	313 627,26	0,00	447,00				447,00	100,00	0,01
DOP-TECH.SPRÁV3217	Systém řízení VSP	1 181 812,00	586 255,55	81 370,00	62 282,00				61 636,40	98,96	533 920,05
DOP-TECH.SPRÁV3220	Broumarská - most a komunikace	172 318,20	31 570,20	5 270,00	23 290,00				23 289,00	100,00	117 459,00
DOP-TECH.SPRÁV3223	Rašínovo nábřeží	354 556,00	246 071,65	80 000,00	80 000,00				79 999,70	100,00	28 484,65
DOP-TECH.SPRÁV3226	Sjízdňá rampa Michelská	52 000,00	4 586,95	0,00	0,00				0,00	0,00	47 413,05
DOP-TECH.SPRÁV4345	MUHK - Připojení V. a M. Chuchle	830 223,00	106 995,14	0,00	357 637,00				299 212,20	83,66	424 015,66
DOP-TECH.SPRÁV4346	Cyklistické stezky	138 314,00	53 416,34	27 800,00	18 097,00				18 097,80	100,00	66 799,86
DOP-TECH.SPRÁV4347	Akce pro BESiP	777 969,00	277 258,89	30 000,00	13 990,00				13 964,40	99,82	486 745,71
DOP-TECH.SPRÁV4348	Zachytňá parkoviště P + R	631 686,00	132 246,77	10 000,00	3 200,00				3 199,90	100,00	496 239,33
DOP-TECH.SPRÁV4361	Karlovarská 2. stavba	465 905,00	12 177,24	0,00	0,00				0,00	0,00	***
DOP-TECH.SPRÁV4892	Nedodělký	74 479,00	14 478,52	0,00	0,00				0,00	0,00	60 000,48
DOP-TECH.SPRÁV4893	Kolbenova - Kbelská	18 262,20	18 206,16	0,00	56,00				56,00	100,00	0,04
DOP-TECH.SPRÁV5092	Jižní spojka - soubor staveb	952 250,00	501 170,51	0,00	119 551,00				117 694,20	98,45	333 385,29
DOP-TECH.SPRÁV5093	Kamýcká - soubor staveb	164 823,41	138 590,61	1 909,80	26 232,80				26 227,70	99,98	5,10
DOP-TECH.SPRÁV5322	Most přes Berounku (včetně rozšíření	623 845,00	608 465,82	0,00	8 077,00				2 796,40	34,62	12 582,78
DOP-TECH.SPRÁV5910	Příprava akcí pro zlepšení infrastr.F	43 980,00	12 033,84	3 134,00	3 241,00				3 240,20	99,98	28 705,96
DOP-TECH.SPRÁV5967	Michelská	212 931,00	1 543,71	0,00	2 300,00				2 300,00	100,00	209 087,29
DOP-TECH.SPRÁV6039	Okrúžní křízovatka Kámycká-Intern	18 461,00	446,85	0,00	0,00				0,00	0,00	***
DOP-TECH.SPRÁV6041	Okrúžní křízovatka Hornoměcholup	8 818,00	0,30	0,00	144,70				144,70	100,00	8 673,00
DOP-TECH.SPRÁV6042	Okrúžní křízovatka Libušská-Kunra	0,00	485,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-485,00
DOP-TECH.SPRÁV6043	Okrúžní křízovatka Přáteřství-K Net	20 030,10	340,10	18 077,00	19 690,00				18 580,30	94,36	1 109,70
DOP-TECH.SPRÁV6046	Příprava staveb	112 395,00	23 019,27	15 000,00	2 000,00				2 015,60	100,78	87 360,13
DOP-TECH.SPRÁV6047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	123,76	0,00	0,00				0,00	0,00	***
DOP-TECH.SPRÁV6048	Zajištění zimní služby	43 180,00	35 978,67	1 800,00	1 800,00				1 799,60	99,98	5 401,73
DOP-TECH.SPRÁV6493	Telematické systémy	130 000,00	9 830,00	10 000,00	10 000,00				9 888,80	98,89	110 281,20
DOP-TECH.SPRÁV6647	Rekonstrukce ul. Českomoravské	850 830,46	849 549,50	0,00	1 281,00				341,30	26,64	939,66
DOP-TECH.SPRÁV6816	Odtahové stanoviště Radlická	3 078,72	2 028,72	0,00	0,00				0,00	0,00	1 050,00
DOP-TECH.SPRÁV6834	Roztocká	60 500,00	651,59	21 895,00	6 000,00				6 000,00	100,00	53 848,41
DOP-TECH.SPRÁV6925	Libeňský most	1 500 000,00	7 999,89	8 000,00	4 812,00				4 811,40	99,99	1 487 188,71
DOP-TECH.SPRÁV7113	U Průhonu	19 172,30	6 112,71	11 990,00	13 060,00				13 060,00	100,00	-0,41

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP za období 12/2005 v tis. Kč

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP za období 12/2005 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava

Odbor / organizace	Cílo akce	Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			% plnění Sč k RU	Zbývá požadavek celkem	
		Název akce		Náklady akce	Profin. k 31.12.2004	RS rok 2005	RU	Poukázaná inv.dotace 1.1.-31.12.2005	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2005		
DOP-TECH.SPRÁV	8113 Branická - odstavné parkoviště	1 867,00		247,94	0,00	119,00			118,10	99,24	1 500,96
DOP-TECH.SPRÁV	8500 Rek.povrchu propoj. ramp a zábrad	48 650,00		0,00	0,00	45 078,50			35 572,80	78,91	13 077,20
DOP-TECH.SPRÁV	8514 Dodávka i instalace označníku TAX	1 732,00		0,00	0,00	1 732,00			1 732,00	100,00	0,00
DOP-TECH.SPRÁV	8534 Autobusová zastávka Hlubočepy	300,00		0,00	0,00	300,00			300,00	100,00	0,00
DOP-TECH.SPRÁV	8565 Rekon. Liberecká a Čínecká z cel	91 840,00		0,00	0,00	30 000,00			30 000,00	100,00	61 840,00
DOP-TECH.SPRÁV	8604 Záhřebská	5 186,40		0,00	0,00	5 186,40			5 186,40	100,00	0,00
DOP-TECH.SPRÁV	8605 Liberecká (úsek Kbelská-Vysočans)	11 300,00		0,00	0,00	11 000,00			9 887,50	89,89	1 412,50
DOP-TECH.SPRÁV	8606 Liberecká (Davídkova-rampa Levínš	34 706,00		0,00	0,00	34 706,00			26 929,00	77,59	7 777,00
DOP-TECH.SPRÁV	8607 Rozvadovská spojka (úsek Řevnick	34 750,00		0,00	0,00	34 750,00			31 272,00	89,99	3 478,00
Celkem odbory MHMP		13 361 041,48	4 752 916,00	778 761,80	1 499 865,20				1 401 945,50	93,47	7 111 954,29
Celkem PO		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	***	0,00
Celkem		13 361 041,48	4 752 916,00	778 761,80	1 499 865,20	0,00	1 401 945,50	93,47	7 111 954,29		

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)

1 401 945,50 93,47

3. Příjmy RO

v tis. Kč	rozpočet	skutečnost	%
§ 2212 – 2111 P+R	5 000	5 416,1	108,32
§ 2212 - 2324 přijaté náhrady	0	412,6	
§ 2212 – 2329 nedaňové příjmy let minulých		6 260,4	

Uvedené příjmy v položce 2111 jsou realizovány ze 14 parkovišť P+R , v položce 2324 je vypořádání DPH ze vstupu za rok 2004(P+R) a v položce 2329 jsou ostatní nedaňové příjmy (vrácené přeplatky účtované jako výdaje minulých let, náhrady za způsobené škody).

4. Hospodářská činnost

V tis. Kč	upr. Rozpočet	skutečnost	%
Výnosy	150 400	214 116,1	142,0
Náklady	44 445	51 165,4	115,0
Z toho správcovská odměna :	15 000 bez DPH	24 756,6s DPH*	165,0

* z celkové správcovské odměny 24 756,6 převedeno na BÚ PO TSK 20 803,89 a zbývající částka 3 952,71tis. Kč činí DPH.

Útvar ekonomického náměstka

Odbor pronájmů v roce 2005 hlavní pozornost zaměřil zejména na úpravu nájemních smluv, vystavování splátkových kalendářů a přebírání komerčních nájemních smluv od OS.

Značná pozornost je věnována práci s pohledávkami.

Nadále odbor pronájmů hlavní pozornost věnuje vyhotovování nájemních smluv, vyhlašování obchodních veřejných soutěží na majetek obce a vyhotovování výpůjčních smluv zejména na vyhrazená stání pro držitele průkazů ZTP. Provádíme kontrolu plnění podmínek zakotvených ve smlouvách..

Kromě vyhotovování nájemních a výpůjčních smluv se odbor pronájmů věnuje práci s podněty občanů, vyhotovování odpovědí na jejich dotazy a běžné administrativní činnosti včetně řešení stížnosti.

Za rok 2005 bylo uzavřeno celkem 2143 výpůjčních a nájemních smluv v členění:

- reklamní poutače, vyhrazené stání za úplatu a nebytové prostory 302
- vyhrazená stání pro držitele průkazky ZTP 831
- pronájmy komunikací k ostatním účelům, pozemků 33
- krátkodobé komerční nájemní a výpůjční smlouvy 934

- NS pro taxistanoviště a VS pro diplomatické mise, ÚMČ a PČR	43
Celkem uzavřeno NS a VS za rok 2005	2143

Úsek správního náměstka

Správní činnost jednotlivých OS spočívá mimo jiné v uzavíraní nájemních a výpůjčních smluv na stavební i komerční účely. Tento proces se řídí vnitropodnikovým přepisem PP31/99.

K uzavření nájemní nebo výpůjční smlouvy je potřeba, aby nájemce doložil ke své žádosti následující doklady: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list příp. plnou moc, vyjádření svodné komise, smlouvu o smlouvě budoucí, situaci a VK. Před uzavřením smlouvy se správní technik účastní místního šetření s investorem, kde jsou dohodnuty podmínky smlouvy – a případná zpětná úprava komunikací dle TP – TSK.

Vystavení jedné smlouvy obnáší:

- kontrolu předložených dokladů
- výpočet nájemného
- zápis do programu GINIS modulu DDP
- sepsání smlouvy
- vystavení platebních a daňových dokladů
- kontrolu ukončení smluvních záborů - fyzická kontrola na místě
- případné zpracování dodatků včetně vystavení platebních dokladů
- kontrola úhrad předepsaných plateb
- kontrola oprav komunikací po smluvních výkopech
- ukončení smlouvy
- kontrola komunikací před ukončením smluvní záruční doby
- vedení evidence

Uzavřené smlouvy jsou týdně pod číselným kódem v tabulkách se základními údaji předávány do Centrální evidence smluv. Úhrady za poskytované služby jsou spolu s jejich evidencí rovněž týdně předávány účtárně.

K 30.9.2005 došlo k převodu komerčních smluv z OS 110 na odbor 360.

K 12.10. 2005 došlo k převodu komerčních smluv z OS 150 na odbor 360.

Správní činnost - uzavírání nájemních a výpůjčních smluv na OS v roce 2005

OS	počet nájemních sml.	počet nájemních sml. stánky	počet výpůjčních sml.	počet havarií výkopové práce
110	935	423	184	1130
120	268	129	54	996
130	253	195	46	1193
140	353	193	49	1 657
150	162	54	41	860
160	359	299	77	1 185
<i>Celkem</i>	2 330	1 293	451	7 021

Převážná část z celkového počtu evidovaných havarií je Pražských vodáren – viz. níže uvedená tabulka.

Havárie Pražských vodáren:

<i>OS 110</i>	597
<i>OS 120</i>	762
<i>OS 130</i>	770
<i>OS 140</i>	1151
<i>OS 150</i>	452
<i>OS 160</i>	604
CELKEM	4 336

Lokalizace nepovolených billboardů:

Dle Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1333 správní úsek prováděl lokalizaci reklamních zařízení a zařizoval odstraňování nepovolených reklamních zařízení.

V roce 2005: Plán Čerpání
 3.000.000,- 2.637.296,-

lokalizace: 1015 ks
z toho zjištěno nepovoleno 72 ks
(zaslána žádost či podnět na odstranění na OD MHMP)

Odstraněno: 11 ks (billboardy)
 147 ks malých reklam

Úsek provozně správního náměstka

Opravy spravovaných objektů:

663 Hlavní nádraží – schodišťové věže

termín realizace: 11/2005 – 06/2006

celkové RN akce: 6 100 tis. Kč

dodavatel: OK – BE spol. s r. o.

projektant: PONTEX

Práce zahájeny předáním staveniště v 11/2005.

664 PG – Kyselova

termín realizace: 2005 – 2006

celkové RN akce: 18 650 tis. Kč (rok 2005 9 000 tis. Kč)

dodavatel: S. P. S. engineering

projektant: TOP-CON

Jedná se o vybourání stav. park. plochy. Nová hydroizolace, nová konstrukce park. plochy, výměna oplocení, vrat, nová elektroinstalace, nové nájezdní lampy.

696 Parkoviště u Výstaviště

termín realizace: 10 – 11/2004

celkové RN akce: 2, 255.052,- Kč

dodavatel: SSŽ, a. s.

projektant: Jaroslav Mika, ATELIER PROMIKA, s. r.o.

Jedná se o úpravu stávajícího parkoviště. Úprava a zrušení vjezdů, lokální opravy obrusných vrstev na celé ploše. Vodorovné dopravní značení nového režimu parkoviště. Akce byla dokončena a převzata ke dni 30. 12. 2004 a uhrazena z prostředků r.2005.

5. Přehled výběrových řízení

V příloze Vám předkládáme přehled „Evidence veřejných zakázek za rok 2005“. Jedná se o veřejné zakázky vypsané dle zákona 40/2004 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář k příloze.

- Jednotlivé zakázky jsou vypsány dle uvedených §§ zákona ve sloupci „Zp. zak.“.
- Jednotlivé akce (název veřejné zakázky) jsou seřazeny podle dne vypsání zakázky.
- U zakázek, kde ještě nedošlo k otevřání obálek nebo výběru nejvhodnější nabídky, jsou další kolonky nevyplněny.

Evidence veřejných zakázek za rok 2005

P.č.	A k c e	Č. jednací	Zp. zák.	Výzva	Otev. Obal	Vybraný zhotovitel	Oznam.	nabídková cena	smlouva
1	Nájem nebytových prostor pro potřeby zadavatele - rozšíření.	3/05/211	§27 3a)	5.1.2005	18.1.2005	AKCENT spol. s r.o.		10.270,-/měs., 492.960,-/r.	25.1.2005
2	Rekonstrukce Štefánikova mostu v Praze 1 a 7, č. akce 999977	8/05/211	§25 2a)	4.3.2005	3.5.2005	Sdružení Štefánikův most - PSVS a SSŽ "Sanzení Chuchle"	16.6.2005	218.529.171,08	22.7.2005
3	Připojení Velké a Malé Chuchle, 2. stavba a oprava ulice Dostihové vč.mostu D061, č akce 900965.	32/05/211	§25 2a)	1.3.2005	12.4.2005	SKANSKA DS a.s.	25.5.2005	145.976.489,-	4.7.20052
4	Cíonecká – výměna dilatací na mostu přes ul. Ďáblickou (X591) v Praze 8.	4/05/211	§27 3d)	7.2.2005	15.3.2005	SOK Třebestovice	12.4.2005	7.451.562,-	13.7.2005
5	Rekonstrukce ulice Sokolská, v úseku Balabenka - Na Břehu, výpracování PD, Praha 9, č akce 999953 - výepráce.	55/05/211	§27 3a)	21.2.2005	7.3.2005	METROPROJEKT Praha a.s.		130.000,-	7.5.2005
6	Oprava chodníků a vozovek v ul. Kolínská - Orlícká v Praze 3,č. akce 35	62/05/211	§27 3d)	24.2.2005	22.3.2005	Čermák a Hrachovec a.s.	5.4.2005	19.423.242,60	3.5.2005
7	Rekonstrukce ulice Broumarská , Praha 14, č. akce 901140 - výepráce.	64/05/211	§27 3a)	28.2.2005	10.3.2005	Commatei - Uher s.r.o.		1.018.957,15	18.5.2005
8	Rekonstrukce komunikace Sokolovská v Praze 9, úsek Balabenka - Na Břehu, č akce 999953	65/05/211	§25 2a)	15.3.2005	26.4.2005	Sdružení RU Sokolovská" SSŽ a.s.	10.5.2005	86.601.052,-	30.5.2005
9	Rekonstrukce chodníků a vozovky v oblasti Břevnov, Petřiny v Praze 6, č. akce 687 - výepráce	74/05/211	§27 3a)	10.3.2005	25.3.2005	INPROS PRAHA v.o.s.		1.560.123,-	30.6.2005
10	Rekonstrukce ulice Chomutovská v Praze 6, č. akce 900003/3- výepráce.	77/05/211	§27 3a)	11.3.2005	25.3.2005	AUTOTRAK, spol. s r.o.		526.654,-	31.3.2005
11	Jížní spojka – oprava spodní stavby mostu X574 – přes údolí Botiče – Zábrdnická, Praha 10, č akce 999356.	83/05/211	§27 3d)	15.3.2005	5.4.2005	Betosan, spol. s r.o.	12.4.2005	26.672.871,-	10.5.2005
12	Ke hřbitovu - sanace pobřežní zdi Dalajského potoka v Praze 5, akce č. 614	105/05/211	§27 3d)	18.3.2005	19.4.2005	Ready spol. s r.o.	6.6.2005	3.672.668,-	15.7.2005
13	Jížní spojka – oprava spodní stavby mostu X565 – nadjezd přes ulici Vlárskou, Praha 4, č akce 999356, 23 etapa.	106/05/211	§27 3d)	22.3.2005	19.4.2005	Super - Krete Czech	3.5.2005	21.666.290,-	6.6.2005
14	Galerie Chotková, oprava spodní strany nosné konstrukce – mostní objekt G - 04, Praha 1, č akce 900682	120/05/211	§27 3d)	30.3.2005	26.4.2005	Betosan, spol. s r.o.	3.5.2005	14.025.920,-	30.5.2005
15	Výstavba nového SSZ 0.6/16 Průmyslová - Teplárenská, v Praze 10, č. 7970236	128/05/211	§25 2a)	25.4.2005	7.6.2005	MERCATOR s.r.o.	14.7.2005	4.692.734,37	1.8.2005
16	Rekonstrukce ulice Broumarská , Praha 14, č. akce 901140 - dodatek.	142/05/211	§27 3a)	18.4.2005	27.4.2005	COMMATEL - Uher, s.r.o.		475.282,-	26.7.2005
17	Cyklistická stezka Černý most - Dolní Počernice v Praze 14, č. akce 2950041	144/05/211	§27 3d)	19.4.2005	17.5.2005	Lubomír Boublík	31.5.2005	3.123.093,26	7.7.2005
18	Rekonstrukce komunikace Novodvorská - Vavřenova v Praze 4, č. akce 171	145/05/211	§27 3d)	20.4.2005	17.5.2005	Pragis a.s.	24.5.2005	8.265.882,-	22.5.2005
19	Komplexní pojistění majetku a odpovědnosti	147/05/211	§25 2a)	6.5.2005	12.7.2005	Kooperativa pojistovna a.s.	20.7.2005	11.770.820,-	16.8.2005
20	Jížní spojka - úprava odvodnění a stabilizace svahu před ulicí Střeboholskou, Praha 10, č akce 999 356, 25 etapa	150/05/211	§27 3d)	20.4.2005	10.5.2005	Heřtka a Kříž s.r.o.	18.5.2005	1.914.536,-	17.6.2005
21	Jížní spojka I sever C, etapa 20, B) Jížní spojka sever - sjízdňá rampa Modřanská, etapa 22 Praha 4 č. akce 999356	151/05/211	§27 3d)	21.4.2005	10.5.2005	PSVS a.s.	31.5.2005	22.265.871,-	24.6.2005
22	Opravy a údržba služebních vozidel	156/05/211	§25 2b)	12.5.2005	20.9.2005	Sdružení PIT LINE	4.11.2005	6.740.240,- Kč/4 toky	8.12.2005
23	Chodníkový program v Praze 5, č akce 900003/9.	157/05/211	§27 3d)	25.4.2005	10.5.2005	AUTOTRAK, spol. s r.o.	24.5.2005	4.587.157,40	10.6.2005
24	výstavba nového SSZ č. 5.498 Bucharová - Peškářská v MČ Praha 13 - dodatek	166/05/211	§27 3a)	27.4.2005	10.5.2005	EL TODO dopr. systémy s.r.o.		385.478,-	25.5.2005

Evidence veřejných zakázků za rok 2005

Rekonstrukce komunikace Černokostelecká, 5. Stavba-větev z centra v úseku	167/05/211	§27 3d)	28.4.2005	24.5.2005	SSŽ a.s. záv. 4	31.5.2005	27.197.696,32	21.6.2005
Úvalská - Sazecská, Praha 10, č. akce 305	178/05/211	§27 3d)	10.5.2005	31.5.2005	SANGREEN, s.r.o.	7.6.2005	17.591.826,15	20.6.2005
26 K Dálniční most B 072 přes Pitkovický potok, Praha 22 - Pitkovice, akce č. 512								
Barrandovský most V/031 - oprava žebraří a sanace zdeček, Praha 4 a 5, č. akce 27 508/900008, etapa č. 4.	179/05/211	§27 3d)	11.5.2005	10.6.2005	SANGREEN, s.r.o.	14.6.2005	28.960.501,-	30.6.2005
28 SÚ akce č. 900006 - Liberecká 3 etapa (13197) v Praze 8.	193/05/211	§27 3d)	10.10.2005	20.10.2005	Skanska DS a.s., záv.80	24.10.2005	28.944.484,-	10.11.2005
29 SÚ akce č. 13 181, ul. Libušská, Praha 4	194/05/211	§27 3d)	23.5.2005	14.6.2005	PSVS a.s.	21.6.2005	11.074.544,17	15.7.2005
30 SÚ akce č. 900008/1 -etapa č. 1 - 13 183 sjezd Barrandovský most Praha 5	195/05/211	§27 3d)	23.5.2005	14.6.2005	Skanska DS	30.6.2005	5.710.765,-	25.7.2005
31 Janáčkovo nábr. v Praze 5, rekonstrukce zdí a náplavky, č. akce 9666036	196/05/211	§27 3d)	23.5.2005	21.6.2005	Zakládání stavby a.s.	30.6.2005	24.429.200,-	18.7.2005
32 SÚ akce č. 13218 Strakonická 6 v Praze 5	200/05/211	§27 3d)	23.5.2005	28.6.2005	PSVS a.s.	18.7.2005	6.995.405,-	10.8.2005
33 SÚ akce č.900008/2, etapa K Barrandovu (13201)v Praze 5.	201/05/211	§27 3d)	25.5.2005	28.6.2005	Skanska DS - z.79	18.7.2005	4.606.673,-	8.8.2005
Proběžní III. 2. Etapa-zpracování DSP pro realizaci komunikace resp. DZS pro výběr dodavatele, č. akce 999 993	208/05/211	§27 3d)	31.5.2005	12.7.2005	PUDIS a.s.	26.7.2005	3.650.500,-	29.8.2005
"A) Jížní spojka Vlisever, úsek nájezdová rampa - Průběžná - Švehlova, Praha 10, etapa 13, B) Jížní spojka Vljih, úsek sjízdná rampa - Průběžná - Švehlova, Praha 35 10. etapa 12, č. akce 999 356."	219/05/211	§27 3d)	9.6.2005	12.7.2005	PSVS a.s.	26.7.2005	6.584.179,-	26.8.2005
36 Chodníkový program Praha 1, č.akce 90000377.	220/05/211	§27 3d)	14.6.2005	28.6.2005	DAP a.s.	12.7.2005	4.960.796	1.8.2005
Troja - hraniční Prahy, Praha 7, č. akce 2950012 - rekonstrukce komunikace - 37 Vícepráce	221/05/211	§27 3a)	13.6.2005	24.6.2005	Lubomír Boublík	251600,-	251.600,-	26.7.2005
38 Chodníkový program Praha 7 - Milady Horákové, č.akce 90000316.	232/05/211	§27 3d)	14.6.2006	1.7.2005	BEB s.r.o.	1.7.2005	3.746.154,05	25.7.2005
39 Galerie Hilton, Praha 8 - napojení cyklostezky, č. akce 2950028 - vicepráce	234/05/211	§27 3a)	15.6.2005	24.6.2005	Lubomír Boublík		551.080,-	26.7.2005
40 SÚ akce č. 12 043, ul. Žampionová 2, Štýchova, Praha 22.	238/05/211	§27 3d)	20.6.2005	12.7.2005	SSŽ a.s.- záv. 4	26.7.2005	3.998.501,-	31.8.2005
41 Cyklistická stezka Řepy, Čistevická - Plzeňská v Praze 17, č. akce 2950044.	240/05/211	§27 3d)	20.6.2005	12.7.2005	LesoPol, spol. s r.o.	19.7.2005	2.603.756,90	12.8.2005
A) Jížní spojka I sever II sever C, etapa 20, B) Jížní spojka I sever - sjízdná rampa	251/05/211	§27 3a)	28.6.2005	12.7.2005	PSVS a.s.			
42 Modřanská, etapa 22 Praha 4 č. akce 999356 - vicepráce	252/05/211	§25 2a)	20.7.2005	30.8.2005	sdruž. NAVATYP	13.10.2005	126.941.533,81	8.11.2005
43 Oprava zdí Nábřeží E. Beneše, Praha 1 a 7, II. etapa, č. akce 96660372	258/05/211	§27 3d)	12.7.2005	26.7.2005	DAP a.s.	26.7.2005	3.287.370,-	18.8.2005
44 Chodníkový program Praha 2, č. akce 725	259/05/211							
45 Kyselova PG, Praha 8 - Dáblíček, č. akce 663."	270/05/211	§27 3d)	13.7.2005	2.8.2005	SPS engineering s.r.o.	10.8.2005	15.671.387,-	15.9.2005
46 Rašínovo nábřeží, Praha 2, IV. etapa, č.akce 901319.	280/05/211	§27 3d)	15.7.2005	9.8.2005	SSŽ a.s. - záv.4	18.8.2005	28.896.341,20	8.9.2005
Galerie Hilton, Praha 8 - napojení cyklostezky, č. akce 2950028 - vicepráce-47 dodatek	282/05/211	§27 3a)	15.7.2005	2.8.2005	Lubomír Boublík		52.657,50	10.8.2005
48 Hlavní nádraží - schodištové véže, Praha 1, č. akce 663	284/05/211	§27 3d)	29.8.2005	20.9.2005	OK - BE s.r.o.	6.10.2005	4.950.430,05	10.11.2005
Akce Besip, úprava křížovatky Londýnská x Jugoslávská, Londýnská x Rumunská v Praze 2	285/05/211	§27 3d)	15.7.2005	9.8.2005	Jiří Toman	29.8.2005	2.957.546,30	23.9.2005
50 Na Výspě - Havlovického -kanalizace, 2 stavba, Praha 4, č. akce 95 - vicepráce.	287/05/211	§27 3a)	19.7.2005	2.8.2005	Pragis a.s.		287.932,64	8.8.2005
51 Na Výspě - Havlovického -komunikace, 2 stavba, Praha 4, č. akce 95 - vicepráce.	288/05/211	§27 3a)	19.7.2005	2.8.2005	Skanska DS a.s.		796.526,50	10.8.2005
52 Rekonstrukce ulice Broumarská, Praha 14, č. akce 901140 - dodatek vicepráce.	290/05/211	§27 3a)	4.7.2005	26.7.2005	Commatel - Uher s.r.o.		897.129,39	15.8.2008
53 Rekonstrukce komunikace U Pruhonu, Praha 7, č. akce 9666031 - vicepráce	301/05/211	§27 3a)	27.7.2005	9.8.2005	STRABAG a.s.		892.329,-	15.9.2005

Evidence veřejných zakázků za rok 2005

Jížní spojka v Praze 4, č. akce 999 356, A) 27 etapa, rampa Z 5. Května na J.S. směr Štěrboholy, B) 28 etapa rampa z J.S na ul. Chodovskou, C) 26 etapa, rampa 54 z J.S. na 5. května směr Brno.	302/05/211	§27 3d)	27.7.2005	16.8.2005	PSVS a.s.	29.8.2005	18.569.470,-	15.9.2005
55 SÚ akce č. 13 187, ul. Táborská v Praze 4	303/05/211	§27 3d)	27.7.2005	16.8.2005	Commatei - Uhř s.r.o.	29.8.2005	5.999.806,13	29.9.2005
56 OK Přátelství - K Netulkám, Praha - Uhříněves, č. akce: 2970084 - vicepráce.	305/05/211	§27 3a)	28.7.2005	9.8.2005	SSŽ a.s. - z.4		1.143.657,83	23.8.2005
57 Rekonstrukce ulice Broumarské v Praze 14, č. akce 901140	315/05/211	§25 2a)	15.9.2005	1.11.2005	Sdružení Broumarská PSVS a DSP	18.11.2005	134.138.435,-	15.12.2005
58 Rekonstrukce komunikaci – Petřiny II., Praha 6, č. akce 703/ 2	316/05/211	§27 3d)	4.8.2005	30.8.2005	SSŽ a.s. záv. 3	6.9.2005	9.849.470,-	21.9.2005
59 Rekonstrukce komunikaci – Baterie II – 1. etapa, Praha 6, č. akce 703/1	317/05/211	§27 3d)	4.8.2005	30.8.2005	Cermák a Hrachovec a.s.	6.9.2005	12.362.637,-	21.9.2005
60 Rekonstrukce komunikaci – Liboc, Praha 6, č. akce 710/4	318/05/211	§27 3d)	4.8.2005	30.8.2005	INPROS PRAHA v.o.s.	6.9.2005	17.584.060,-	21.9.2005
SÚ akce č. 132119 (9000083) Barrandovský most - nájezd na Strakonickou v Praze 5	320/05/211	§27 3d)	4.8.2005	30.8.2005	Skanska a.s. záv. 79	9.9.2005	4.788.540	30.9.2005
Rekonstrukce komunikace Křížková II. stavba, úsek Karloňské nám. – Thámová, v Praze 8, č. akce 9999560/2 - vicepráce	321/05/211	§27 3a)	4.8.2005	23.8.2005	SSŽ a.s. záv. 4		4.621.837,81	18.10.2005
Rekonstrukce komunikace Křížková III. stavba, úsek Thámová - Hypešova, v Praze 8, č. akce 9999560/3 - vicepráce	322/05/211	§27 3a)	4.8.2005	23.8.2005	PSVS a.s.		5.519.995,-	6.9.2005
Pobřežní (Pnvního pluku – U nadražní lávky), Praha 8, č. akce 9666020 - vicepráce	323/05/211	§27 3a)	4.8.2005	23.8.2005	Skanska DS a.s.		2.087.862,-	15.9.2005
Křížková -rekonstrukce ulice Thámová, Praha 8, č. akce 9999560/7.	325/05/211	§27 3d)	4.8.2005	30.8.2005	SSŽ záv. 4		8.822.581,-	6.10.2005
Rekonstrukce ulice Šaldova, Praha 8, č. akce 9666019.	326/05/211	§27 3d)	4.8.2005	30.8.2005	PSVS a.s.		9.9.2005	29.525.375,-
Rekonstrukce BBP – Litochleby II v Praze 11, č. akce 60098 - vicepráce.	327/05/211	§27 3a)	8.8.2005	23.8.2005	Lubomír Boublík		176.311,-	6.9.2005
Chodníkovy program MC Praha 7 - Troja, ul. Nad Kazankou II. a III. etapa, č. akce 68 900003/10.	328/05/211	§27 3d)	8.8.2005	6.9.2005	Lubomír Boublík	9.9.2005	4.073.044,37	30.9.2005
Mimoúrovňové křížení silnice I/4 Strakonická v prostoru Malé Chuchle, č. akce 69 901802" a „Propojení V. a M. Chuchle I. stavba, č. akce 901669 – vicepráce.	331/05/211	§27 3a)	9.8.2005	23.8.2005	Sdružení Chuchle - PSVS a.s.		4.035.688,-	9.9.2005
Propojení Velké a Malé Chuchle - 1.b stavba, oprava ulice Bezejmenné v Malé Chuchli, Praha 16, č. akce 901659.	332/05/211	§27 3d)	9.8.2005	6.9.2005	PSVS a.s.	15.9.2005	14.893.570,-	27.9.2005
Rekonstrukce ulice Roztocké, úsek Kamýcká – V Rokli v Praze 6, č. akce 9666028	345/05/211	§25 2b)	20.9.2005	13.12.2005	Skanska DS a.s., záv.80	13.12.2005	49.730.020,-	21.12.2005
Oprava komunikace Moskevská v úseku U Seřadiště – Baškirska, Praha 10, č. akce 72 akce 729.	355/05/211	§27 3d)	30.8.2005	20.9.2005	Skanska DS a.s., z.80	30.9.2005	5.838.975,-	10.10.2005
Cyklistická stezka Černý most - Dolní Počernice, č. akce 2950041-vicepráce	362/05/211	§27 3a)	2.9.2005	20.9.2005	Lubomír Boublík		576.657,60	30.9.2005
74 Rekonstrukce chodníků – Československé armády, Praha 6, č. akce 710/8	368/05/211	§27 3d)	5.9.2005	20.9.2005	AUTOTRAK, spol. s r.o.	23.9.2005	5.039.456,60	30.9.2005
75 SÚ akce č. 13 214 Do Horoměřic v Praze 6.	377/05/211	§27 3d)	7.9.2005	27.9.2005	SSŽ a.s., záv.4	13.10.2005	13.639.172,-	10.11.2005
Rekonstrukce drážního nájezdu „Moskevská – Bohdalec“ v Praze 10, č. akce 76 999965 - vicepráce.	381/05/211	§27 3a)	9.9.2005	27.9.2005	Sdružení SKANSKA +MPS, Skanska DS		9.994.222,-	18.11.2005
Provozování nově vybudovaných parkovacích garáží P+R v objektu Chodov	386/05/211	§27 1b)	14.9.2005	4.10.2005	PARKING PRAHA a.s.		7.960.800,-/4 roky	7.11.2005
77 Centrum v Praze 11,	392/05/211	§27 3d)	16.9.2005	4.10.2005	PSVS a.s.	6.11.2005	8.626.363,-	9.11.2005
78 SÚ Strakonická, Praha 5.	393/05/211	§27 3d)	16.9.2005	4.10.2005	SSŽ a.s., záv.4	13.11.2005	29.200.709,-	2.11.2005
79 SÚ akce č. 13 220 Rozvadovská spojka 5 v Praze 5.	394/05/211	§27 3d)	19.9.2005	10.10.2005	PSVS a.s.		3.340.896,-	9.11.2005
80 SÚ 5. května – nájezdová rampa ze Špeřílovské směr Brno, Praha 4.	395/05/211	§27 3d)	19.9.2005	10.10.2005	SSŽ a.s., záv.4	24.10.2005	1.914.968,-	9.11.2005
81 SÚ 12.5. května - nájezdová rampa z ul. Modřanská (smer Praha 10), Praha 4.	396/05/211	§25 2a)	10.10.2005	22.11.2005	PARKING PRAHA a.s.	8.12.2005	4.579.200,-	3.12.2006

Evidence veřejných zakázků za rok 2005

83 Rekonstrukce chodníku a části vozovky Evropská v Praze 6, SFDI Cinovecká – výměna dilatační na mostu přes ul. Dářlickou (X591) v Praze 8 - 84 vicepráce.	397/05/211 §27 3d)	19.9.2005	10.10.2005	AUTOTRAK, spol. s r.o.	24.10.2005	5.022.797,-	26.10.2005
85 Rekonstrukce chodníků – ul. Někrasova, Praha 6, č. akce 710/10 86 Oprava komunikace Petřská v Praze 1, č. akce 96660614.	398/05/211 §27 3a)	20.9.2005	14.10.2005	SOKTFebestovice s.r.o.		1.200.000,-	19.12.2005
87 Rekonstrukce komunikace Sokolovská v Praze 9, úsek Balabenka – Na Bránu, č. akce 9999953 - vicepráce	400/05/211 §27 3d)	21.9.2005	4.10.2005	DAP a.s.	6.10.2005	3.112.293,-	24.10.2005
88 Sanace povrchu opěrné zdi - Rozvadovská spojka z centra, Praha 13	402/05/211 §27 3d)	21.9.2005	4.10.2005	INPROS PRAHA v.o.s.	27.10.2005	9.805.285,-	11.11.2005
89 Na Výspě - Havířovického -komunikace, 2 stavba, Praha 4, č. akce 95 - dodatek	403/05/211 §27 3a)	23.9.2005	29.9.2005	Sdružení RU Sokolovská" SSŽ a.s.		5.831.406,55	11.10.2005
90 Kamýcká soubor staveb – záliv, podchod, č. akce 1999969 v Praze 6 - vicepráce. Jížní spojka – oprava spodní stavby mostu X565 – nadjezd přes ulici Vídeňskou, 91 Praha 4, č. akce 999356, 23. etapa - vicepráce.	410/05/211 §27 3d)	3.10.2005	18.10.2005	SUPER - KRETE Czech s.r.o.	24.10.2005	10.050.083,-	7.11.2005
90 Kamýcká soubor staveb – záliv, podchod, č. akce 1999969 v Praze 6 - vicepráce. Jížní spojka – oprava spodní stavby mostu X565 – nadjezd přes ulici Vídeňskou, 91 Praha 4, č. akce 999356, 23. etapa - vicepráce.	419/05/211 §27 3a)	4.10.2005	14.10.2005	Skanska DS a.s.		825.070,-	
92 BÚ - podchod Na Jetelce (P 506) pod ul. Vysočanskou, Praha 9	420/05/211 §27 3a)	6.10.2005	18.10.2005	SSŽ a.s., záv.4		835.798,8	24.10.2005
93 BÚ - Nečkanová, záklennutí Botiče - nová část, Praha 2	423/05/211 §27 3a)	6.10.2005	18.10.2005	SUPER - KRETE CZECH s.r.o.		2.048.448,-	25.11.2005
94 Oprava připojky horské vypusti, Jižní spojka - Spořilov západ, Praha 4	424/05/211 §27 3d)	7.10.2005	25.10.2005	SANGREEN, spol. s r.o.	10.11.2005	3.714.837,83	28.11.2005
95 SÚ akce č 900009 - Liberecká (131974) v Praze 8. BÚ – Estakáda Povltavská (X543), sanace spodní stavby mostu směr centrum,	425/05/211 §27 3d)	7.10.2005	25.10.2005	D+ Z vodovody a kanalizace s.r.o.	10.11.2005	19.317.981,17	29.11.2005
96 Praha 8 Barrandovský most V 031 - oprava zábradlí a sanace zádelek, Praha 4 a 5, č. 97 akce 508/900008- vicepráce	435/05/211 §27 3d)	12.10.2005	1.11.2005	Skanska DS a.s., záv.80	24.10.2005	9.232.007,-	23.11.2005
98 MÚK Jižní spojka – Zábrdnická (X 574), stavební úpravy pod mostem, Praha 10 K Dálnici, most B 072 přes Pitkwický potok, Praha 22 - Pitkvice, akce 512 - 99 vicepráce	436/05/211 §27 3d)	12.10.2005	20.10.2005	SUPER - KRETE Czech s.r.o.	16.11.2005	29.730.593,-	6.12.2005
Nábreží E. Beneše – sanace opěrných zdí po povodni v Praze 1 a 7 , SO 1.1 (opěanská plovárna) a SO 1.5 (U Pichla), č.akce 9666037/3- vicepráce."	437/05/211 §27 3d)	12.10.2005	1.11.2005	Betosan, spol. s r.o.	16.11.2005	4.056.750,-	28.11.2005
100 Doplňení SW a HW na HDRU pro zprovoznění oblastní ústředny TAT a rozšíření 101 SW vizualizace ODRU 4 na HDRU.	438/05/211 §27 3a)	13.10.2005	25.10.2005	Sangreen, spol. s. ro.		1.313.527,92	1.11.2005
102 Nájem nebytových prostor pro oblastní správu 160 v Praze 6	439/05/211 §27 3d)	13.10.2005	1.11.2005				
Rekonstrukce komunikace Novodvorská – Vávřenova v Praze 4, č. akce 171 - 103 vicepráce	440/05/211 §27 3a)	14.10.2005	25.10.2005	SUPER - KRETE CZECH s.r.o.		1.688.510,-	14.11.2005
104 Oprava chodníků a vozovky ve Střešovických v Praze 6, č. akce 687/5 - vicepráce. "jížní spojka v Praze 4, č. akce 939 356, A) 27 etapa, rampa z 5. května na J.S., směr Šípobor, B) 28 etapa rampa Z J.S na ul. Chodovskou, C) 26 etapa, rampa Z J.S. na 5. května směr Brno - vicepráce.	441/05/211 §27 3a)	14.10.2005	25.10.2005	SIGNALBAU HUBER CZ s.r.o.		3.710.630,-	27.12.2005
105 Opravy a znovu využití budování odvodnacích systémů na mostech hl. m. Prahy	442/05/211 §27 3a)	1.11.2005	9.11.2005	Pragis a.s.		49.210 Kč/měs.	15.12.2005
106 Cyklistická stezka Řepy, Čistovická - Plzeňská v Praze 17, č. akce 2950044 – 107 vicepráce	443/05/211 §27 3a)	1.11.2005	9.11.2005	PSVS a.s.		857.577,22	16.11.2005
	447/05/211 §27 1b)	17.10.2005	9.11.2005	SSŽ a.s., záv.3		2.042.895,96	29.11.2005
105 Opravy a znovu využití budování odvodnacích systémů na mostech hl. m. Prahy	450/05/211 §27 3a)	18.10.2005	10.11.2005	MOSTSERVIS s.r.o.	14.12.2005	535.785,-	25.11.2005
Cyklistická stezka Řepy, Čistovická - Plzeňská v Praze 17, č. akce 2950044 – 107 vicepráce	448/05/211 §27 3a)	17.10.2005	9.11.2005	Lesopol, spol. s.r.o.		15.576.385,-	23.12.2005
	451/05/211 §27 3a)	18.10.2005	10.11.2005			249.950,91	19.12.2005

Evidenze veřejných zakázek za rok 2005

6. Vyhodnocení kontrolní činnosti

1. Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole

Již od počátku roku 2004 jsou úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, z jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a z Pravidel pro zabezpečování fungování kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou vydaných usnesením Rady hlavního města Prahy v TSK hl. m. Prahy zajištěny směrnici SM 13/99 Zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v TSK hl. m. Prahy. Tato směrnice, společně s ostatními upravenými a příslušně doplněnými vnitroorganizačními předpisy, vytváří dostatečný legislativní rámec k rádnému zajištění úkolů finanční kontroly v Technické správě komunikací hlavního města Prahy. V organizaci rovněž již druhým rokem funguje samostatné oddělení kontroly a interního auditu, které je v organizační struktuře TSK hl. m. Prahy přímo podřízeno řediteli organizace.

2. Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole

Řídící kontrola, ve všech třech svých fázích, je v organizaci uskutečňována nejen při běžném výkonu funkce vedoucích zaměstnanců, ale i tím, že náměstci ředitele organizace každoročně v termínu do 10. prosince běžného roku zpracovávají plán kontrolních akcí jimi řízeného úseku, který předají oddělení kontroly a interního auditu. Zde jsou, po prověření zda splňují požadavky kladené na řídící kontrolu, sumarizovány za organizaci a jako závazný plán řídících kontrol vydány formou příkazu ředitele. O provedení zde uvedených kontrol je vyhotovován písemný záznam. Plnění tohoto plánu je průběžně kontrolováno oddělením kontroly a interního auditu. V roce 2005 byl ze strany oddělení kontroly a interního auditu proveden i plánovaný audit funkčnosti vnitřního kontrolního systému organizace zaměřený na provádění řídící kontroly a její účinnost. Pro sledované období uvedený plán řídících kontrol obsahoval celkem 74 kontrolních akcí a byl v průběhu roku, na základě poznatků auditu a následného rozhodnutí ředitele organizace doplněn o dvě kontrolní akce v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto řídící kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování interních předpisů, úplnost účetních a daňových dokladů, soulad fakturace s kvalitou a množstvím provedených prací dodavateli a dodržování obecně platných právních norem. Vytvořený systém řídících kontrol lze hodnotit jako dostatečný. Nedostatky závažného charakteru, které by bránily zajištění stanovených úkolů organizace nebyly zjištěny. Méně závažné nedostatky byly průběžně řešeny v kompetencích náměstků. Ve dvou případech byly výsledky využity při sestavování ročního plánu interních auditů pro rok 2006. Jedná se o problematiku hospodaření s vybouraným materiélem a o činnost autoprovozu TSK hl. m. Prahy.

3. Zhodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

Oddělením kontroly a interního auditu byly počátkem r. 2005 dokončeny 2 audity z plánu na r. 2004. Ve sledovaném období bylo, po provedené analýze vzniku možných rizik a po konzultaci s ředitelem organizace, zařazeno 7 auditů. Všechny tyto audity byly provedeny. Kromě nich byly ještě provedeny, na žádost ředitele organizace, 3 mimořádně zařazené audity ve smyslu ustanovení § 30 odst. 6 zákona č. 320/2001 o finanční kontrole. Vesměs se jednalo o audity systému (§28 odst. 4 písm. b) zák. 320/2001 Sb.) a audity výkonu (§28 odst. 4 písm. c) zák. 320/2001 Sb.). Ve třech případech byl kombinován audit systému s auditem finančním (§28 odst. 4 písm. a) zák. č. 320/2001 Sb.).

Konkrétně se jednalo o audity zaměřené na:

- audit Zadávání vybraných veřejných zakázek v rámci TSK hl. m. Prahy (zák. č. 40/2004 Sb.),
- audit Hospodaření s pohledávkami z nájemních smluv (PP 20/01 – Vymáhání pohledávek z nájemních smluv a další interní předpisy),
- audit Dodržování pracovního postupu PP 03/00 – Poskytování služeb a zboží za úhradu včetně užívání komunikací,
- audit Vnitřního kontrolního systému – řídící kontroly,
- audit Prověření vybraných mandátních smluv uzavřených k zajištění stavebních akcí se zaměřením na jejich úplnost a správnost,
- audit Zadávání vybraných veřejných zakázek v rámci TSK hl. m. Prahy (zák. č. 40/2004 Sb.),
- audit Hospodaření s pohledávkami z nájemních smluv (PP 20/01 – Vymáhání pohledávek z nájemních smluv a další interní předpisy).

Mimo plán byly provedeny následující tři audity:

- audit Průběhu smluvních vztahů mezi TSK HMP a f. CAMEA, s.r.o.,
- audit Uzavírání smluvních vztahů mezi TSK HMP a smluvními partnery z pohledu zákonů č. 199/1994 Sb. resp. č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
- audit Činnosti autoprovozu TSK HMP.

Při proovených interních auditech byly zjišťovány nedostatky (např. nedostatečná aktualizace interních předpisů, nedodržení interních předpisů, nedostatečné uplatňování smluvních postihů, nedodržení některých ustanovení obecně platných právních).

Zprávy o všech proovených auditech byly projednány za účasti příslušného náměstka, manažera jakosti, vedoucího auditovaného útvaru, vedoucího odd. kontroly a interního auditu a ředitele organizace, který vždy uložil potřebná a auditem navržená opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

V rámci činnosti odd. kontroly a interního auditu bylo provedeno i 11 následných prověrek plnění opatření k nápravě uložených z dříve proovených kontrolních akcí. Z těchto následných kontrol lze konstatovat, že opatření uložená ředitelem organizace jsou plněna. Určitým nedostatkem je ta skutečnost, že opatření jsou někdy plněna až po termínech, do kterých bylo jejich plnění uloženo.

Stížnosti

Centrální evidence stížností

Oddělením kontroly a interního auditu je ve smyslu ustanovení vl. vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností vedena centrální evidence stížností přijatých na TSK hl. m. Prahy. Zde byly v r. 2005 zaevidovány celkem 183 stížnosti.

Z hlediska oprávněnosti bylo vyhodnoceno 152 stížností (83 %) jako neoprávněné, 16 stížností (9 %) jako částečně oprávněné a 13 stížností (7 %) jako oprávněné. Zbývající 2 stížnosti (1 %) byly postoupeny jiným subjektům z důvodu nepříslušnosti TSK hl. m. Prahy k jejich vyřízení.

Z hlediska členění stížností podle organizačních úseků TSK bylo evidováno 166 stížností (91 %) proti SÚ, 1 stížnost (1%) proti TÚ, 6 stížností (3 %) proti EÚ, 8 stížností (4 %) proti PÚ, žádná stížnost proti IÚ, 2 stížnosti (1 %) proti úseku ředitele. Z celkového počtu 166 stížností evidovaných u SÚ bylo 139 stížností na odtahy vozidel.

Ve sledovaném období nedošlo ani jednou k překročení 30 denní lhůty k vyřízení stížnosti. U oprávněných a částečně oprávněných stížností byla vždy příslušným náměstkem přijata opatření k napravě včetně vyvození pracovně právních důsledků vůči odpovědným zaměstnancům. Lze konstatovat, že vyřizování stížností je věnována náležitá pozornost a vl. vyhláška č. 150/58 Ú.l. je dodržována.

Stížnosti na odtahy silničních vozidel

Ve sledovaném období bylo oddělením odtahů provedeno celkem 14 114 odtahů z veřejného zájmu včetně KÚK (§ 19, odst. 5, a 6, zák. č. 13/97 Sb.). Oddělením kontroly a interního auditu bylo v tomto období zaevidováno 139 stížností na odtahy. Z uvedeného vyplývá, že stížnostmi byla rozporována oprávněnost u 1 % realizovaných odtahů. Ve srovnatelném období loňského roku bylo zaevidováno 208 stížností a provedeno 14 007 odtahů což představovalo 1,5 % stížností z realizovaných odtahů. To představuje meziroční pokles o 0,5 % při poklesu o 69 stížností což činí 67 %. Meziroční nárůst počtu odtahů činil 107 odtahů, t.j. 0,8 %.

Z celkového počtu 139 stížností na odtahy vozidel byla z hlediska oprávněnosti 131 stížnost neoprávněná, 5 stížností oprávněných, 1 stížnost částečně oprávněná a 2 stížnosti byly z důvodu věcné příslušnosti postoupeny jiným subjektům. V 23 případech byly žádosti občanů, prokazujících závažné důvody vedoucí k neodstranění vozidla, předány oddělením kontroly a interního auditu k přímému vyřízení odboru odtahů.


Vyhodnocení stížností za r. 2005

Použité číselníky

Úseky		Oprávněnost	
SU	úsek správní	OP	oprávněná
TU	úsek technický	OC	oprávněná částečně
EU	úsek ekonomický	NE	neoprávněná
IU	úsek informační	PO	postoupená jinam
PU	úsek provozně-správní	A	v řízení
Ř	úsek ředitele		
ne	dosud neurčeno		


počet z oprávněnost	oprávněnost					
proti komu	PO	NE	OC	OP	A	Celkový součet
EU		4	2			6
PU		4	3	1		8
SU	2	142	10	12		166
TU			1			1
Ř		2				2
ne						
IU						
Celkový součet	2	152	16	13		183

Stížnosti podle oprávněnosti

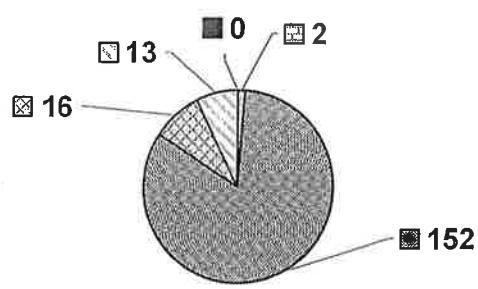


■ PO ■ NE ■ OC ■ OP ■ A

Stížnosti podle úseků

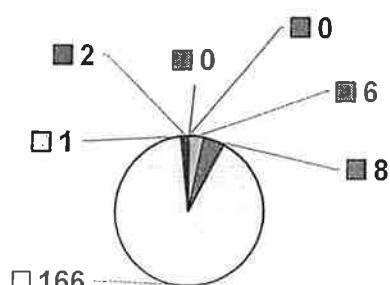


■ EU ■ PU ■ SU ■ TU ■ Ř ■ ne ■ IU

Vývoj počtu stížností na odtahy vozidel
v letech 1999 - 2005

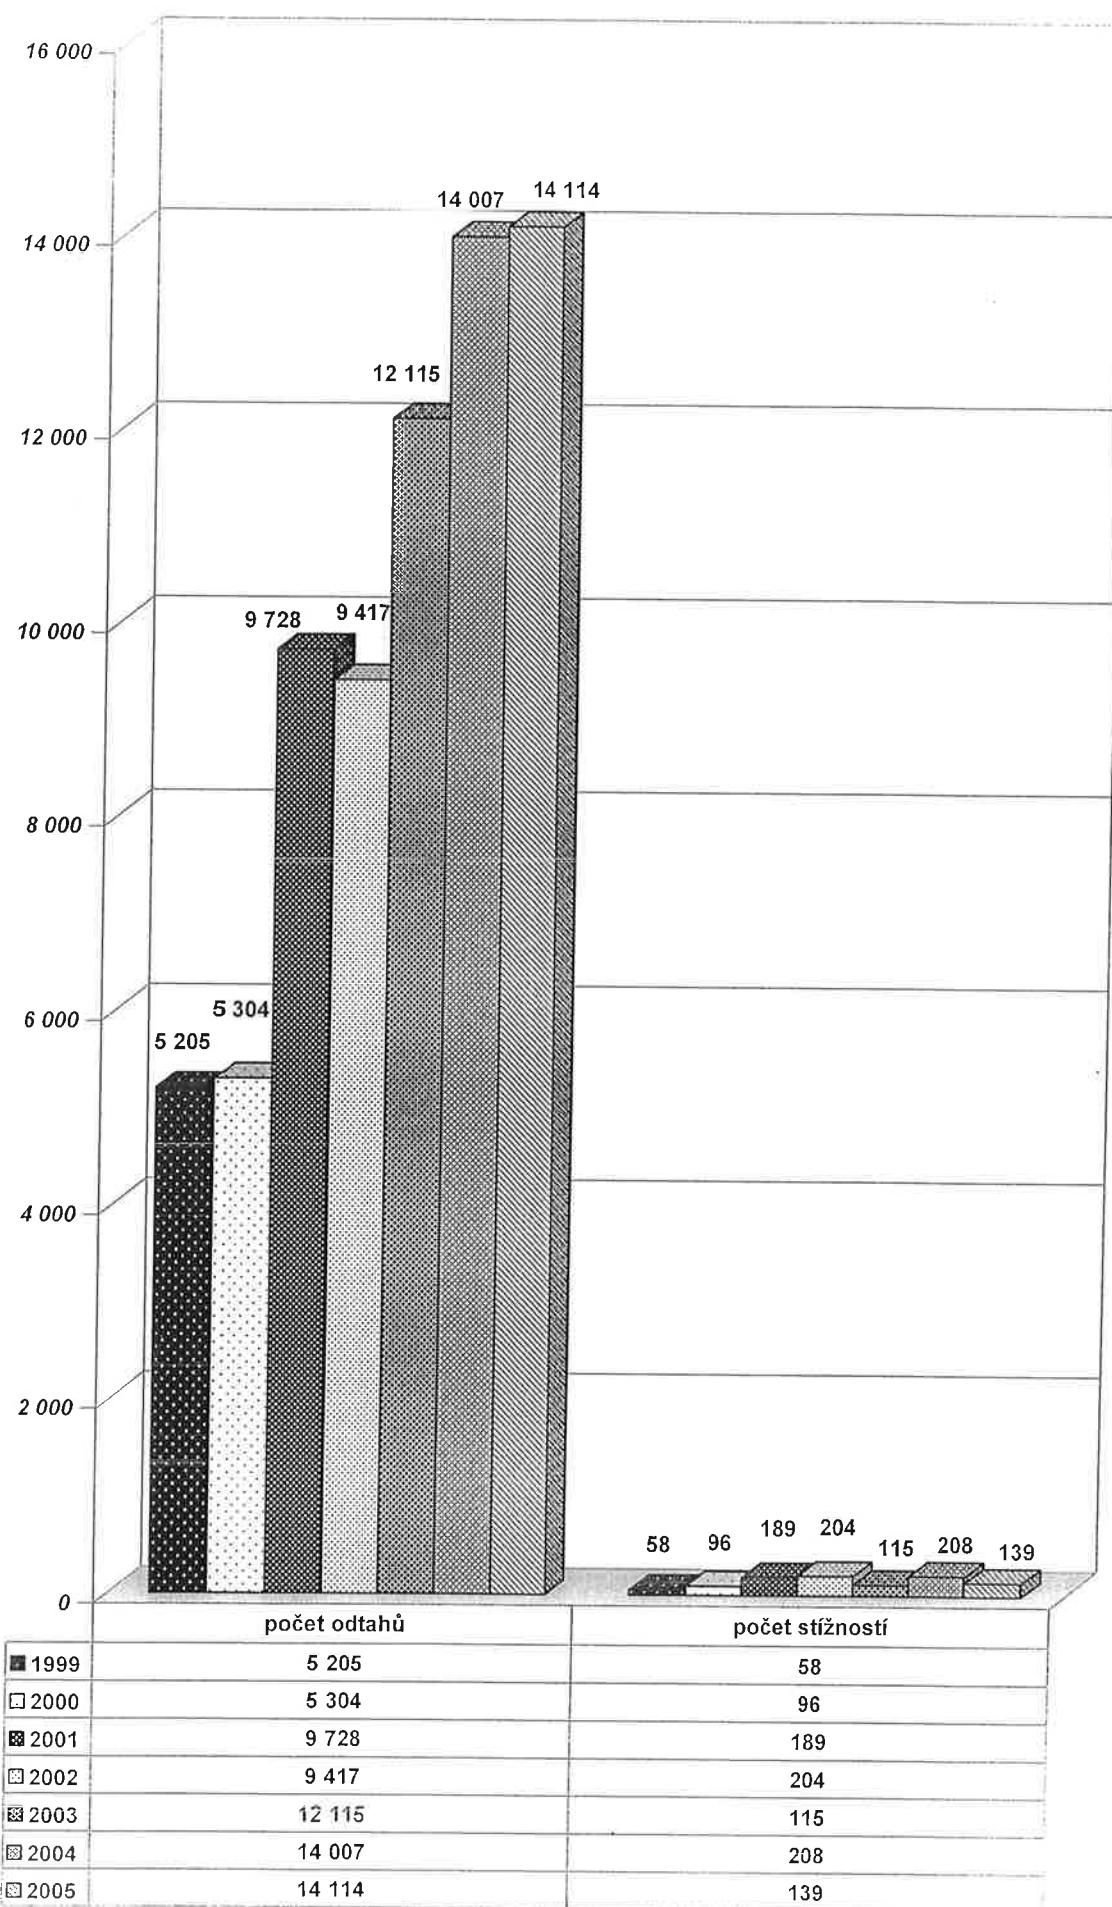

**Vývoj počtu stížností na odtahy vozidel
v letech 1999 - 2005**

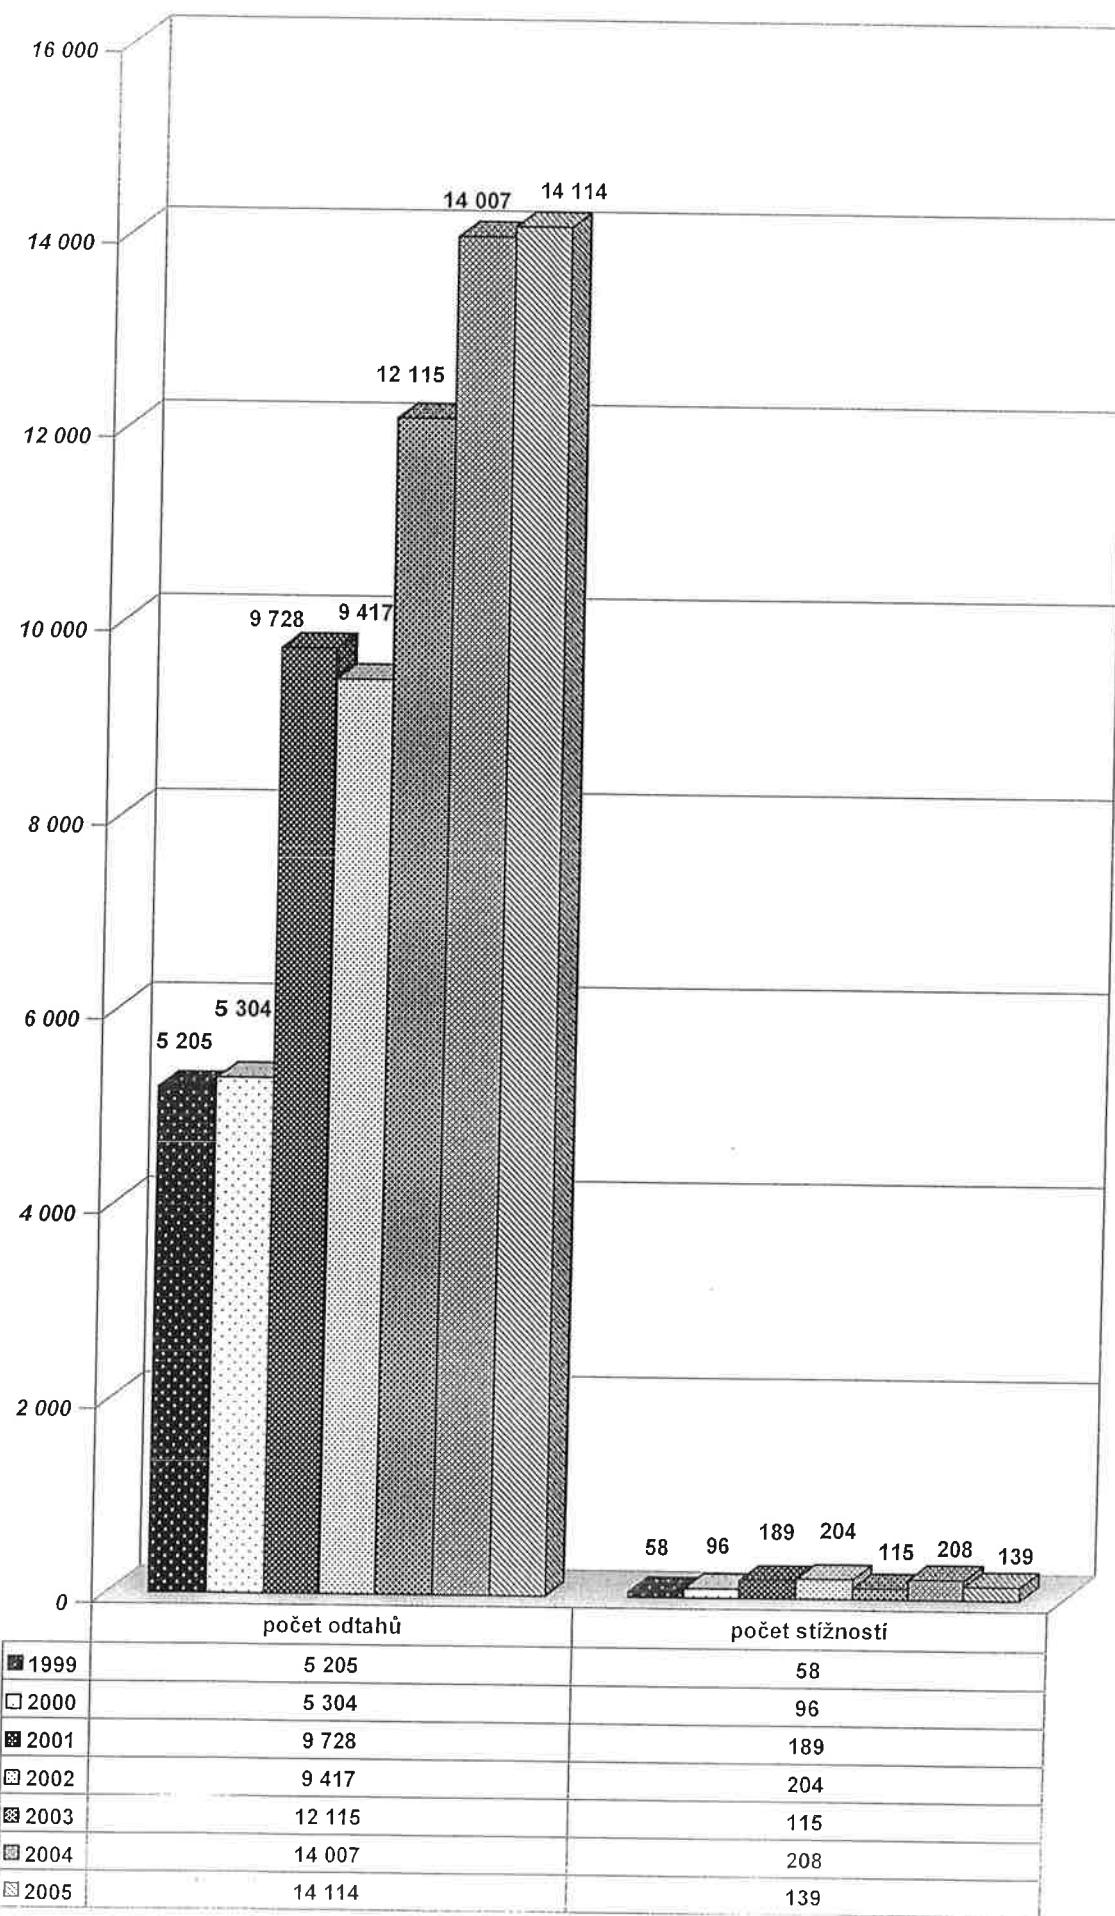

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * *

Strana: 1

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
NS : 00914649 HČ - TSK RO
Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

UCRGA01A 20052005 14:54
Čas : 08:04:12
Datum: 10.02.2006

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2005
(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2005	12	00064581

Název nadřízeného orgánu :

Název a sídlo účetní jednotky : Magistrát hl. m. Prahy

Štefánikova 23/203, 150 00 Praha 5

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
				1	2			
<hr/>								
I.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 375 838 970,99	*****	*****	*****
*	0000	Bez QDPA	0,00	0,00	3 375 838 970,99	*****	*****	*****
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000 000,00	5 000 000,00	5 416 140,91	108,32	108,32	108,32
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	412 632,59	*****	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedáňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 260 472,48	*****	*****	*****
*	2212	Silnice	5 000 000,00	5 000 000,00	12 089 245,98	241,78	241,78	241,78
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
Celkem:			5 000 000,00	5 000 000,00	3 387 928 216,97	*****	*****	*****

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
NS : 00914649 RČ - TSK RO

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

UCRGBALA 2005/2005 14:54

Čas : 08:04:12

Datum: 10.02.2006

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/R/S % Č/RU %
			1	2			
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
2212 5139 Nákup materiálu j.n.			62 000 000,00	66 144 000,00	66 142 489,53	106,68	100,00
2212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	870 000,00	602 180,86	*****	69,22
2212 5164 Nájemné			0,00	322 889 000,00	850 008,06	*****	85,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb			326 200 000,00	327 124 866,20	100,28	101,31	
2212 5171 Opravy a udržování			715 163 600,00	1 029 067 500,00	1 022 193 056,08	142,93	99,33
2212 6121 Budovy, haly a stavby			750 961 800,00	1 474 191 200,00	1 380 764 852,01	183,87	93,66
2212 6130 Pozemky			0,00	7 577 000,00	3 082 837,50	*****	40,69
* 2212 *** Silnice			1 854 325 400,00	2 901 738 700,00	2 800 760 290,24	151,04	96,52
2219 5139 Nákup materiálu j.n.			100 000,00	16 000,00	15 784,00	15,78	98,65
2219 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			350 000,00	167 900,00	163 990,00	46,85	97,67
2219 5151 Studená voda			450 000,00	483 000,00	456 968,72	101,55	94,61
2219 5153 Plyn			200 000,00	147 000,00	146 903,30	73,45	99,93
2219 5154 Elektrická energie			11 821 000,00	12 141 600,00	12 077 665,50	102,17	99,47
2219 5156 Pohonné hmoty a maziva			150 000,00	100 000,00	91 015,31	60,68	91,02
2219 5161 Služby pošt			3 000,00	8 200,00	8 111,00	270,37	98,91
2219 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			374 000,00	347 500,00	302 626,78	80,92	87,09
2219 5163 Služby peněžních ústavů			382 000,00	2 139 900,00	2 034 625,00	532,62	95,08
2219 5164 Nájemné			600 000,00	600 000,00	525 100,00	87,52	87,52
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby			17 150 000,00	15 136 000,00	15 193,15	88,25	99,99
2219 5168 Služby zpracování dat			16 170 000,00	15 982 100,00	15 981 708,96	98,84	100,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb			41 817 000,00	39 628 300,00	39 623 414,59	94,75	99,99
2219 5171 Opravy a udržování			100 000,00	43 000,00	42 186,40	42,19	98,11
2219 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny			0,00	0,00	0,00	*****	*****
2219 5191 Zaplacené sankce			200 000,00	42 000,00	41 325,00	20,66	98,39
2219 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			61 250 000,00	61 010 000,00	61 010 000,00	99,61	100,00
2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			317 000,00	204 000,00	198 318,00	62,56	97,21
2219 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2219 *** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			151 434 000,00	148 196 500,00	147 854 935,71	97,64	99,77
2221 5169 Nákup ostatních služeb			0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2221 *** Provoz veřejné silniční dopravy			0,00	0,00	0,00	*****	*****
2229 5151 Studená voda			0,00	0,00	0,00	*****	*****
2229 5171 Opravy a udržování			0,00	0,00	0,00	*****	*****
2229 5179 Ostatní nákupy j.n.			409 000 000,00	409 000 000,00	409 125 893,68	100,03	100,03
* 2229 *** Ostatní záležitosti v silniční dopravě			409 000 000,00	409 000 000,00	409 125 893,68	100,03	100,03
2229 6121 Budovy, haly a stavby			27 800 000,00	18 097 000,00	18 097 851,36	65,10	100,00
* 2229 *** Ostatní záležitosti v dopravě			27 800 000,00	18 097 000,00	18 097 851,36	65,10	100,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			0,00	0,00	12 089 245,98	*****	*****

NS : 00914649 HČ - TSK RO
IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

URGBALA 20052005 14:54
Čas : 08:04:15
Datum: 10.02.2006

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název

text

Krátkodobé financování z tuzemská

Číslo položky / řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1			3
2			

Dlouhodobé financování z tuzemská

Krátkodobé vydané dluhopisy Uhraněné splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhraněné splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(+)	8111 (-) 8112 (+) 8113 (-) 8114 (+) 8115 (+) 8117 (-) 8118	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	-----	--	--	--

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhraněné splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhraněné splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(+)	8121 (-) 8122 (+) 8123 (-) 8124 (+) 8125 (+) 8127 (-) 8128	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	-----	--	--	--

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy Uhraněné splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhraněné splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(+)	8211 (-) 8212 (+) 8213 (-) 8214 (+) 8215 (+) 8217 (-) 8218	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	-----	--	--	--

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhraněné splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhraněné splátky dlouhodobých přijatých Půjč. prostř. Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(+)	8221 (-) 8222 (+) 8223 (-) 8224 (+) 8225 (+) 8227 (-) 8228	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	-----	--	--	--

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter Příjmu a výdajů vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	(+-)	8901 (+-) 8902 8000	0,00 0,00 0,00 0,00
--	------	------------------------------	------------------------------

NS : 0091469 HČ - TSK RO
 IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
 VÍKÁZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku
 IV. REKAPITUJACE PŘÍJMY, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

VÝKÁZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku
 UCRCBA1A 20052005 14:54
 Čas : 08:04:15
 Datum: 10.02.2006

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet x	Rozpočet po změnách 41	Výsledek od počátku roku 43
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	0,00	0,00	0,00
TRÍDA 2 - NEDRŽANOVÉ PŘÍJMY	4020	5 000 000,00	5 000 000,00	12 089 245,98
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	0,00	0,00	3 375 838 970,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 000 000,00	5 000 000,00	3 387 928 216,97
KONSOLIDACE PŘÍJMU	4060	0,00	0,00	0,00
V tom položky:				
2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
mezi krajem a obcemi				
2441 - splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - splátky půjčených prostředků od kraju	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - ostatní splátky půjčených prostředků	4090	0,00	0,00	0,00
od veřejných rozpočtů územní úrovně				
4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100	0,00	0,00	0,00
4122 - neinvestiční přijaté dotace od kraju	4110	0,00	0,00	0,00
4129 - ostatní neinvestiční přijaté dotace	4120	0,00	0,00	0,00
od rozpočtu územní úrovně				
*4133 - převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
*4134 - převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
*4139 - ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - investiční přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - investiční přijaté dotace od kraju	4180	0,00	0,00	0,00
4229 - ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtu	4190	0,00	0,00	0,00
územní úrovně				
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých	4192	0,00	0,00	0,00
z území jiného okresu				
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých	4194	0,00	0,00	0,00
z území jiného kraje				
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 000 000,00	5 000 000,00	12 089 245,98
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 663 797 600,00	1 977 167 000,00	1 985 982 676,10
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	778 761 800,00	1 499 865 200,00	1 401 945 540,87
VÝDAJE CELKEM	4240	2 442 559 400,00	3 477 032 200,00	3 387 928 216,97
KONSOLIDACE VÝDAJU	4250	0,00	0,00	0,00
V tom položky:				
5321 - neinvestiční dotace obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323 - neinvestiční dotace krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5329 - ostatní neinvestiční dotace veřejným	4280	0,00	0,00	0,00
rozpr. územní úrovně				

 IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
 NS : 00914649 HČ - TSK RO

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

		UCRGBA1A 20052005 14:54
*5342	- převody FKSP sociálnímu fondu obcí a krajů	4281 0,00 0,00
*5344	- převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290 0,00 0,00
*5345	- převody vlastním rozpočtovým účtům	4300 0,00 0,00
*5349	- ostatní převody vlastním fondům	4310 0,00 0,00
5366	- výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321 0,00 0,00
5641	- neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330 0,00 0,00
5642	- neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340 0,00 0,00
5649	- ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350 0,00 0,00
6341	- investiční dotačce obcím	4360 0,00 0,00
6342	- investiční dotačce krajům	4370 0,00 0,00
6349	- ostatní investiční dotače veřejným rozp. územní úrovně	4380 0,00 0,00
6441	- investiční půjčené prostředky obcím	4400 0,00 0,00
6442	- investiční půjčené prostředky krajům	4410 0,00 0,00
6449	- ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4420 0,00 0,00
ZJ 026	- Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421 0,00 0,00
ZJ 027	- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422 0,00 0,00
ZJ 035	- Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423 0,00 0,00
ZJ 036	- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424 0,00 0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430 2 442 559 400,00	3 477 032 200,00 3 375 838 970,99
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU PO KONSOLIDACI	4440 -2 437 559 400,00	-3 472 032 200,00 -3 363 749 725,01
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450 0,00	0,00 0,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460 0,00	0,00 0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470 0,00	0,00 0,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * *

Strana: 7

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
NS : 00914649 HČ - TSK RO
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚCTECH
Název bankovního účtu
text

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

Základní běžný účet	6010	0,00	0,00	0,00
Vkladový výdajový účet	6020	X	0,00	0,00
Běžné účty peněžních fondů	6030		0,00	0,00
BĚŽNÉ ÚCTY CELKEM	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	6050	X	0,00	X
Příjmový účet	6060	X	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7191	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od rozp. územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků z území jiného okr.	7140	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
5366 - výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7191	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční dotace obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozp. územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za vykazující jednotku

NS : 00914649 HČ - TSK RO *****
 ***** Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00
 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7300 0,00
 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0,00 0,00
 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od kraju 0,00 0,00
 4129 - Ost. neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7320 0,00 0,00
 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 0,00 0,00
 4222 - Investiční přijaté dotace od kraju 0,00 0,00
 4229 - Ost. investiční přijaté dotace od rozpočtu územní úrovně 7330 0,00 0,00
 0,00 0,00

ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00
 v tom položky:
 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00
 2442 - splátky půjčených prostředků od kraju 7380 0,00 0,00
 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00
 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00
 v tom položky:
 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7410 0,00 0,00
 5323 - Neinvestiční dotace krajům 7420 0,00 0,00
 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřej. rozp. územní úrovně 7430 0,00 0,00
 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00
 6341 - Investiční dotace obcím 7440 0,00 0,00
 6342 - Investiční dotace krajům 7450 0,00 0,00
 6349 - Ost. investiční dotace veřejným rozpočtem územní úrovně 7460 0,00 0,00
 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00
 v tom položky:
 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00
 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00
 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 0,00 0,00
 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00
 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00
 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 0,00 0,00

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele
text

Číslo žádku	Rozpočet po změnách	Schválený rozpočet	Výsledek od počátku roku
I	81	82	83
8010			
8020			
8030			
8040			
8050			

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * *

Strana: 9

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy
NS : 00914649 HČ - TSK RO

IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

Čas : 08:04:15
Datum: 10.02.2006

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2005 za výkazující jednotku

UCRGA1A 20052005 14:54
Účelový ČÚC Položka
znak
a b c

Dotace celkem
*** Konec části IX. ***

Výsledek od
počátku roku
93

0,00

Odesláno dne:

Razitko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
tel.:

o skutečnosti:
tel.:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

řádná	X	mimořádná		mezitímní		* typ závěrky označte 'X'
-------	---	-----------	--	-----------	--	------------------------------

sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2005

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	HČ - TSK RO
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta Štefánikova 23/203 Praha 5 15000
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta Štefánikova 23/203 Praha 5 15000
IČO	00064581
Právní forma	magistrát
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
OKEČ	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	
Okamžik sestavení	10.02.2006 08:04:55
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce (statutátor)	
Podpisový záznam statutárního orgánu	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

Čas : 08:04:56

Datum: 10.02.2006

ROZVHAHA - BILANCE za období 12/2005 v Kč

NS : 00914649 HČ - TSK RO

UCRGUA60 30052005 11:19

ROZVHAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a přispěvkových organizací
(v Kč)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00064581	Magistrát hl. m. Prahy	12/2005

A K T I V A - Název položky	Účet číslo	Položka	Stav k 1.1.	Stav k 31.prosinci
			1	2

A. STÁLÁ AKTIVA	01	46 325 524	084,75	49 158 546 136,08
součet položek 09+15+26+33+41				

1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	0,00	0,00
Software	(013)	03	0,00	227 800,00
Ocenitelná práva	(014)	04	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	122 218,80	122 218,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	122 218,80	350 018,80
součet položek 02 až 08				

2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	0,00	0,00
Oprávky k softwaru	(073)	11	0,00	0,00
Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	0,00	0,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13	0,00	0,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15	0,00	0,00
součet položek 10 až 14				

3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	(031)	16	12 731 129 760,65	13 401 431 779,34
Umělecká díla a předměty	(032)	17	0,00	0,00
Stavby	(021)	18	28 656 689 256,23	30 877 318 705,85
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	752 004 405,98	1 065 228 248,26
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	0,00	0,00
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	494 253,80	494 253,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	4 151 278 705,67	3 775 017 292,61
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	33 805 483,62	38 705 837,42
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	46 325 401 865,95	49 158 196 117,28
součet položek 16 až 25				

4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávky ke stavbám	(081)	27	0,00	0,00
Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28	0,00	0,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	0,00	0,00
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	0,00	0,00
Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31	0,00	0,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33	0,00	0,00
součet položek 27 až 32				

5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	0,00	0,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	0,00	0,00
Dlužné cenné papiry držené do splatnosti	(063)	36	0,00	0,00
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	0,00	0,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	0,00	0,00
součet položek 34 až 40				

B. OBĚŽNÁ AKTIVA	42	91 977 846,28	2 097 824 600,43
součet položek 51+75+89+119+124			

1. ZÁSOBY				
Materiál na skladě	(112)	43	5 558 885,44	4 368 000,75
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44	0,00	0,00
Nedokončená výroba	(121)	45	0,00	0,00
Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0,00	0,00
Výrobky	(123)	47	0,00	0,00
Zvířata	(124)	48	0,00	0,00
Zboží na skladě	(132)	49	0,00	0,00

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

Čas : 08:04:56

Datum: 10.02.2006

ROZVÁHA - BILANCE za období 12/2005 v Kč

UCRGUA60 30052005 11:19

NS : 00914649 HČ - TSK RO

A K T I V A - Název položky

Účet Položka
čísloStav k 1.1.
1Stav k 31.prosinci
2

Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50	0,00	0,00
Zásoby celkem		51	5 558 885,44	4 368 000,75
součet položek 43 až 50				

2. POHLEDÁVKY

Odběratelé	(311)	52	0,00	0,00
Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00
Pohledávky za eskortované cenné papiry	(313)	54	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	15 713 014,02	70 071 821,71
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	2 556 220,41	3 280 132,04
Ostatní pohledávky	(316)	57	0,00	0,00
součet položek 52 až 57		58	18 269 234,43	73 351 953,75
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	-1 316,36
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341)	61	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	64	0,00	0,00
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00
součet položek 61 až 64		66	0,00	0,00
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	0,00	0,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	0,00	0,00
součet položek 67+68		69	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	0,00	0,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00
Jiné pohledávky	(378)	72	2 799 472,96	83,03
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00
součet položek 70 až 73		74	2 799 472,96	83,03
Pohledávky celkem		75	21 068 707,39	73 350 720,42
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				

3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	(261)	76	0,00	0,00
Penize na cestě	(262)	77	0,00	0,00
Ceniny	(263)	78	0,00	0,00
součet položek 76 až 78		79	0,00	0,00
Běžný účet	(241)	80	0,00	0,00
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	0,00	0,00
Ostatní běžné účty	(245)	82	65 350 253,45	48 023 395,21
součet položek 80 až 82		83	65 350 253,45	48 023 395,21

Majetkové cenné papiry	(251)	84	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry	(253)	85	0,00	0,00
Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	0,00	0,00
součet položek 84 až 87		88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem		89	65 350 253,45	48 023 395,21
součet položek 79+83+88				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

A. ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	(231)	90	0,00	0,00
Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00
Příjmový účet	(235)	92	X	0,00
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	0,00	0,00
Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00
součet položek 90 až 95		96	0,00	0,00
Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	0,00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0,00
součet položek 97 až 102		103	X	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0,00	0,00
součet položek 104 až 108		109	0,00	0,00
Limity výdajů	(221)	110	X	0,00
Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	0,00
Materiální náklady	(410)	112	X	1 835 160 572,16
Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	136 921 911,89
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0,00
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0,00
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0,00
Manka a škody	(460)	117	X	0,00

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

Čas : 08:04:56

Datum: 10.02.2006

ROZVaha - BILANCE za období 12/2005 v Kč

NS : 00914649 HČ - TSK RO

UCRGUA60 30052005 11:19

A K T I V A - Název položky

Účet Položka

Stav k 1.1.

Stav k 31.prosinci

číslo

1

2

součet položek 112 až 117	118	X	1 972 082 484,05
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	0,00	1 972 082 484,05
součet položek 96+103+109+110+111+118			

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Náklady příštích období	(381) 120	0,00	0,00
Příjmy příštích období	(385) 121	0,00	0,00
Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	(388) 123	0,00	0,00
Přechodné účty aktivní celkem	124	0,00	0,00
součet položek 120 až 123			

A K T I V A C E L K E M
součet položek 01+42

125 46 417 501 931,03 51 256 370 736,51

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

Čas : 08:04:56

Datum: 10.02.2006

ROZVÁHA - BILANCE za období 12/2005 v Kč

NS : 00914649 HČ - TSK RO	Účet Položka	Stav k 1.1.	Stav k 31.prosinci	UCRGUA60 30052005 11:19
P A S Í V A - Název položky	číslo	3	4	
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	46 296 843 203,78	51 079 821 949,52	součet položek 130+131+138+141+151+158
1. MAJETKOVÉ FONDY				
Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	46 324 217 874,37	49 136 543 526,30	
Fond oběžných aktiv	(902) 128	5 558 885,44	4 368 000,75	
Fond hospodářské činnosti	(903) 129	0,00	0,00	
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909)	130	0,00	0,00	
Majetkové fondy celkem	131	46 329 776 759,81	49 140 911 527,05	
součet položek 127 až 129				
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
Fond odměn	(911) 132	0,00	0,00	
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133	0,00	0,00	
Fond rezervní	(914) 134	0,00	0,00	
Fond reprodukce majetku	(916) 135	0,00	0,00	
Peněžní fondy	(917) 136	0,00	0,00	
Jiné finanční fondy	(918) 137	0,00	0,00	
Finanční a peněžní fondy celkem	138	0,00	0,00	
součet položek 132 až 137				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
Státní fondy	(921) 139	0,00	0,00	
Ostatní zvláštní fondy	(922) 140	0,00	0,00	
Fondy EU	(924) 203	0,00	0,00	
Zvláštní fondy OSS celkem	141	0,00	0,00	
součet položek 139, 140 a 203				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
Financování výdajů OSS	(201) 142	X		0,00
Financování výdajů ÚSC	(211) 143	X	1 971 137	344,36
Bankovní účty k limitům OSS	(223) 144	X		0,00
Vyučtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205) 145	X		0,00
Vyučtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215) 146	X	706	634,14
Vyučtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206) 147	X		0,00
Vyučtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216) 148	X		0,00
Zúčtování příjmů ÚSC	(217) 149	X		0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150	0,00		0,00
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem	151	0,00	1 971 843	978,50
součet položek 142 až 150				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) 152		X		0,00
Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153		0,00		0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154		0,00	X	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155		0,00		0,00
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156	-35 306 992,63	-35 306 992,63		
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157	2 373 436,60	2 373 436,60		
součet položek 152 až 157	158	-32 933 556,03	-32 933 556,03	
D. CIZÍ ZDROJE	159	120 658 727,25	176 548 786,99	
součet položek 160+166+189+196+201				
1. REZERVY				
Rezervy zákonné	(941) 160	0,00	0,00	
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
Vydané dluhopisy	(953) 161	0,00	0,00	
Závazky z pronájmu	(954) 162	0,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163	0,00	0,00	
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164	0,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165	0,00	0,00	
Dlouhodobé závazky celkem	166	0,00	0,00	
součet položek 161 až 165				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
Dodavatelé	(321) 167	58 841 299,61	142 603 684,63	
Směnky k úhradě	(322) 168	0,00	0,00	
Přijaté zálohy	(324) 169	5 430 136,00	258 242,30	
Ostatní závazky	(325) 170	56 196 869,13	29 484 263,73	
Závazky z pevných terminových operací a opcí	(373) 171	0,00	0,00	
součet položek 167 až 171	172	120 468 304,74	172 346 190,66	
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367) 173	0,00	0,00	
Závazky k účastníkům sdružení	(368) 174	0,00	4 002 535,03	
součet položek 173 až 174	175	0,00	4 002 535,03	
Zaměstnanci	(331) 176	0,00	0,00	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 177	0,00	0,00	

IČO: 00064581 Magistrát hl. m. Prahy

Čas : 08:04:56

Datum: 10.02.2006

ROZVaha - BILANCE za období 12/2005 v Kč

UCRGUA60 30052005 11:19

NS : 00914649 HČ - TSK RO	PASÍVA - Název položky	Účet číslo	Položka	Stav k 1.1.	Stav k 31.prosinci
				3	4

součet položek 176 až 177		178		0,00	0,00
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179		0,00	0,00
Daň z příjmů	(341)	180		0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342)	181		0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182		0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	183		0,00	0,00
součet položek 180 až 183		184		0,00	0,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		0,00	0,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		0,00	0,00
součet položek 185 až 186		187		0,00	0,00
Jiné závazky	(379)	188	190	422,51	200 061,30
Krátkodobé závazky celkem		189	120	658 727,25	176 548 786,99
součet položek 172+175+178+179+184+187+188					

4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY

Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		0,00	0,00
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		0,00	0,00
součet položek 193 až 194		195		0,00	0,00
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		0,00	0,00
součet položek 190+191+192+195					

5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ

Výdaje příštích období	(383)	197		0,00	0,00
Výnosy příštích období	(384)	198		0,00	0,00
Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	(389)	200		0,00	0,00
Přechodné účty pasivní celkem		201		0,00	0,00
součet položek 197 až 200					

PASIVA CELKEM	202	46 417 501	931,03	51 256 370	736,51
součet položek 126+159					

*** Konec sestavy za NS 00914649 ***

Pevné omezení dat:

Organize:

Výúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2005

Tabuľka č. 5a

Vypracoval/a: Nepevná

Telefon: 257015530

15.1.2005

Vyučování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu za rok 2005

Výnáročová/a: Neprovádě

Telefon: 2 57015530

Dne: 15.1.2006

Podpis ředitele:
Bazitko



Výpis z účtu

K účtu: 3009-63125011 /0710 CZK

Ze dne: 06.01.2006

Poř.č.: 2

Strana: 1 z 1

Cetnost: denní

Typ účtu: Fin.prostř.SFDI-neinv.výdaje

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ19 0710 0030 0900 6312 5011



TSKR P00246HW

HLAVNI MESTO PRAHA

7612 - Pobočka Praha - referát 21
297/6207/3625

MARIANSKE NAM. 2
110 01 PRAHA 1

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 02.01.2006 460 266,24

Debetní obrat (5) 458 975,10

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 06.01.2006 1 291,14

Počet položek celkem: 5

Limit debetního zůstatku: 0,00

Datum účtování	Externí identifikátor	Datum valuty	Datum odeslání	Ceník (CZK)
Číslo účtu a název protipartnera				
06.01.2006	0501761200552001	06.01.2006		-54 808,00
	9324001/0710 ST FOND DOPR INFRAST			
	Int.id:06105N0007601 Vsy:5111110001 Ksy:1818		Ssy:2212532335	
06.01.2006	0501761200552002	06.01.2006		-26 320,00
	9324001/0710 ST FOND DOPR INFRAST			
	Int.id:06105N0007616 Vsy:5111110001 Ksy:1818		Ssy:2212532335	
06.01.2006	0501761200552003	06.01.2006		-5 269,00
	9324001/0710 ST FOND DOPR INFRAST			
	Int.id:06105N0007618 Vsy:5111110001 Ksy:1818		Ssy:2212532335	
06.01.2006	0501761200552004	06.01.2006		-186 289,00
	9324001/0710 ST FOND DOPR INFRAST			
	Int.id:06105N0007622 Vsy:5111110001 Ksy:1818		Ssy:2212532335	
06.01.2006	0501761200552005	06.01.2006		-186 289,10
	9324001/0710 ST FOND DOPR INFRAST			
	Int.id:06105N0007625 Vsy:5111110001 Ksy:1818		Ssy:2212532335	
Konečný zůstatek				1 291,14

Vyúčtování investičních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2005

Cílo akce	Název akce	Učel. znak	SR 2005 v tis. Kč	UR 2005 v tis. Kč	k 31.12.2005 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
3217	Systém řízení MSP	94	81 370,0	62 282,0	61 636 422,60	645 577,40	
3220	Broumarská-most a komunikace	94	5 270,0	23 290,0	23 289 000,70	999,30	
3223	Rašínovo nábřeží	94	80 000,0	80 000,0	79 999 673,81	-326,19	
4345	MÚK Chuchle	94	0,0	27 735,0	27 735 000,06	-0,06	
	MÚK Chuchle	91628	216 402,0	329 902,0	271 477 184,80	58 424 815,20	
4347	Akce pro Besip	94	30 000,0	13 990,0	13 964 429,30	25 570,70	
4348	Záchylná parkoviště	94	10 000,0	3 200,0	3 199 887,50	112,50	
5092	Jižní spojka soubor staveb	94	0,0	3 200,0	3 199 999,90	0,10	
	Jižní spojka soubor staveb	91628	70 000,0	116 351,0	114 494 195,90	1 856 804,10	
5093	Kamýcká soubor staveb	94	1 909,8	4 909,8	4 904 733,40	5 066,60	
	Kamýcká soubor staveb	91628	0,0	21 323,0	21 322 990,00	10,00	
5322	Rekonstrukce Most přes Berounku	94	0,0	8 077,0	2 796 472,00	5 280 528,00	
5910	příprav akcí pro zl.infrastruktury PID MHD	94	3 134,0	3 241,0	3 240 207,50	792,50	
5967	Michelská	94	0,0	2 300,0	2 300 000,00	0,00	
6041	OK Hornoměcholupská Milánská	94	0,0	144,7	144 704,00	-4,00	
6043	OK Přátelství- K Nětlukám	94	18 077,0	19 690,0	18 580 337,00	1 109 663,00	
6046	Příprava staveb	94	15 000,0	2 000,0	2 015 626,30	-15 626,30	
6048	Zajištění zimní služby	94	1 800,0	1 800,0	1 799 647,00	353,00	
6493	Telematické systémy	94	10 000,0	10 000,0	9 888 818,00	111 182,00	
					665 988 329,77		

Číslo akce	Název akce	Účel. znak	SR 2005		UR 2005		Skutečnost		Rozdíl v Kč	Poznámka
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	k 31.12.2005 v Kč	v Kč		
6647	Českomořavská	94	0,0	1 281,0	341 338,50	939 661,50				
6834	Roztocká	94	21 895,0	6 000,0	6 000 000,00	0,00				
6925	Libeňský most	94	8 000,0	4 812,0	4 811 392,40	607,60				
7113	U Průhonu	94	9 800,0	10 840,0	10 839 989,89	10,11				
	U Průhonu	88	2 190,0	2 220,0	2 220 000,00	0,00				
7114	Přístavni	94	8 100,0	7 588,0	7 587 239,24	760,76				
	Přístavni	88	5 875,0	9 650,0	9 650 000,00	0,00				
7116	Křížková	94	71 000,0	68 203,0	68 195 264,10	7 735,90				
7117	Pobřežní	94	0,0	2 797,0	2 796 635,70	364,30				
	Pobřežní	88	7 000,0	7 334,0	7 334 000,00	0,00				
7121	Haštalské náměstí	94	0,0	44,3	44 268,00	32,00				
7125	Hlavíčkův most	94	9 980,0	1 000,0	1 000 000,00	0,00				
7296	Štefánikův most	94	0,0	1 277,7	1 277 700,40	-0,40				
7334	Šádlova	88	26 700,0	13 700,0	13 699 729,90	270,10				
7338	nář. E. Beneše	94	70 000,0	44 000,0	43 989 845,07	10 154,93				
7559	Alšovo nábřeží	94	21 000,0	18 012,3	18 012 270,04	29,96				
7560	Chodvnikový program	94	10 000,0	41 191,9	41 191 935,08	-35,08				
7561	Chatkova	94	0,0	16 757,0	16 756 652,00	348,00				
7562	Janáčkovo nábřeží	94	18 950,0	18 950,0	18 949 999,80	0,20				
7563	Moskevská Bohdalec	94	53 894,0	75 330,0	75 328 870,70	1 129,30				
					350 027 130,82					

Číslo akce	Název akce	Účel. znak	SR 2005		UR 2005		Skutečnost k 31.12.2005		Rozdíl v Kč	Poznámka
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč		
7564	Na Maniách	94	25 000,0	43 784,7	37 888 292,80		5 896 407,20			
7565	Pobřežní III.	94	43 000,0	10 667,0	10 666 763,20		236,80			
7567	Výskočilová 5.květná nájrampa	94	0,0		116,2		116 200,00		0,00	
7568	Za Elektárnu	94	32 517,0	35 987,0	35 979 809,07		7 190,93			
7785	Pomořanská park.stářní	94	1 000,0		1 311,6		1 076 082,00		235 518,00	
7876	SSZ Českobrodská/Ml.Běchovice	94	3 500,0	2 073,0	572 577,00		1 500 423,00			
4346	Cykloslezský	94	27 800,0	18 097,0	18 097,0		18 097 851,36		-851,36	
8001	Sokolovská,Balabenka,Na Břehu	94	40 000,0	114 034,0	114 034 810,07		-810,07			
8005	Petrská	94	0,0	19 230,1	19 230 100,00		0,00			
8105	U Libeňského pivovaru	94	0,0		19 040,00		19 040,00		-40,00	
8110	Malešická	94	0,0	340,0	340 002,00		-2,00			
8111	Pražská Švehlova	94	0,0	160,5	160 494,00		6,00			
8113	Branická,odst.parkoviště	94	0,0	119,0	118 107,00		893,00			
8500	Rák.zábradlí Barrandovského mostu	94	0,0	568,5	568 434,60		65,40			
	Rák.zábradlí Barrandovského mostu	91628	0,0	44 510,0	35 004 403,89		9 505 596,11			
8534	Autobus.zastávka Hlubočepy	94	0,0	300,0	300 000,00		0,00			
8514	Dodávka a instalace označníků TAXI	94	0,0	1 732,0	1 731 932,00		68,00			
8565	Rek.Liberecká a Čínochovská	91628	0,0	30 000,0	29 999 988,30		11,70			
4893	Kolbenova Kbelská	94	0,0	56,0	55 977,60		22,50			
8106	Vltavská	94	0,0	35,7	35 700,00		0,00			
8108	U Sluncové	94	0,0	222,8	222 771,20		28,80			
					306 219 336,09					

Pl

Číslo akce	Název akce	Účel. znak v tis. Kč	SR 2005 v tis. Kč	UR 2005 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2005 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
3208	mост Zličín, Řevnická	94	0,0	447,0	447 000,00	0,00	
8604	Záhředská	94	0,0	5 186,4	5 186 369,90	30,10	
8605	Liberecká úsek Kbelská-Vysokočanská do centra	91628	0,0	11 000,0	9 887 479,40	1 112 520,60	
8606	Liberecká úsek Davidková-rampa Levinská	94	0,0	262,0	261 562,00	438,00	
	Liberecká úsek Davidková-rampa Levinská	91628	0,0	34 444,0	26 667 535,30	7 776 464,70	
8607	Rozvadovská spojka/Řevnická hrani.Prahy	91628	0,0	34 750,0	31 272 033,69	3 477 966,31	
8053	SSZ Průmyslová Teplárenská	94	5 000,0	5 988,0	5 987 763,90	236,10	
	calkem		1 065 163,8	1 499 985,2	1 401 945 540,87		
Zpracoval/a/	Nepěvná	Dne:	17.1.2005	Podpis ředitele:	ing. L.Dostál		
		Telefon:	257015530	Razitko			
HMP		94			844681,2		
HMP		88			32904		
SFDI		91628			6222280		
	celkem				1499865,2		
							

Technické



HMP	94		844681,2
HMP	88		32904
SFDI	91628		6222280
			1499865,2

Přehled o předmětech pořízených na leasing

Tabulka č. 7

w/ u nákupu realizovaných od 1.1.2001 uvést čís.usn.RHMP, kterým byl nákup odsouhlasen ve smyslu § 35 zák. č. 250/2000 Sb.

Vypracoval/a: Nepevná

Telefon: 275015530

Telefon:

15.1.2006

**VYÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE A PRONÁJMU STÁTNÍHO MAJETKU
ZA ROK 2005**

1) Pronájmy

Příjmy (výnosy)	0
Výdaje (náklady) na údržbu	0
Technické zhodnocení	0
Paušální částky stanovené v rámci nájemného (např. voda, teplo, úklid)	0
Odvod při finančním vypořádání	0

2) Prodeje

Příjmy (výnosy)	0
Výdaje (náklady) související s prodejem majetku	0
Odvod při finančním vypořádání	0

Podpis ředitele organizace (razítko):
ing. Luděk Dostál



Zpracoval/a: Nepevná

Telefon: 257015530

Dne: 13.1.2005

Vyúčtování investičních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2005

Číslo akce	Název akce	Učel. znak	SR 2005 v tis. Kč	UR 2005 v tis. Kč	k 31.12.2005 v Kč	Skutečnost k 31.12.2005 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
3217	Systém řízení MSP	94	81 370,0	62 282,0	61 636 422,60	645 577,40		
3220	Broumarská-most a komunikace	94	5 270,0	23 290,0	23 289 000,70	999,30		
3223	Rašínovo nábřeží	94	80 000,0	80 000,0	79 999 673,81	326,19		
4345	MÚK Chuchle	94	0,0	27 735,0	27 735 000,06	-0,06		
	MÚK Chuchle	91628	216 402,0	329 902,0	271 477 184,80	58 424 815,20		
4347	Akce pro Besíp	94	30 000,0	13 990,0	13 964 429,30	25 570,70		
4348	Záchytrá parkoviště	94	10 000,0	3 200,0	3 199 887,50	0,10		
5092	Jižní spojka soubor staveb	94	0,0	3 200,0	3 199 999,90			
	Jižní spojka soubor staveb	91628	70 000,0	116 351,0	114 494 195,90	1 856 804,10		
5093	Kamýcká soubor staveb	94	1 909,8	4 909,8	4 904 733,40	5 066,60		
	Kamýcká soubor staveb	91628	0,0	21 323,0	21 322 990,00	10,00		
5322	Rekonstrukce Most přes Berounku	94	0,0	8 077,0	2 796 472,00	5 280 528,00		
5910	příprav akcí pro zl. infrastruktury PID MHD	94	3 134,0	3 241,0	3 240 207,50	792,50		
5967	Michelská	94	0,0	2 300,0	2 300 000,00	0,00		
6041	OIK Hornoměcholupská Milánská	94	0,0	144,7	144 704,00	-4,00		
6043	OK Přátelství K Netulkám	94	18 077,0	19 690,0	18 580 337,00	1 109 663,00		
6046	Příprava staveb	94	15 000,0	2 000,0	2 015 626,30	-15 626,30		
6048	Zajištění zimní služby	94	1 800,0	1 800,0	1 799 647,00	353,00		
6493	Telematické systémy	94	10 000,0	10 000,0	9 888 818,00	111 182,00		
					665 989 329,77			

Číslo akce	Název akce	Účel. znak	SR 2005 v tis. Kč	UR 2005 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2005 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
6647	Českomoravská	94	0,0	1 281,0	341 338,50	939 661,50	
6834	Roztocká	94	21 895,0	6 000,0	6 000 000,00	0,00	
6925	Libeňský most	94	8 000,0	4 812,0	4 811 392,40	607,60	
7113	U Průhonu	94	9 800,0	10 840,0	10 839 989,89	10,11	
	U Průhonu	88	2 190,0	2 220,0	2 220 000,00	0,00	
7114	Přístavní	94	8 100,0	7 588,0	7 587 239,24	760,76	
	Přístavní	88	5 875,0	9 650,0	9 650 000,00	0,00	
7116	Křížíková	94	71 000,0	68 203,0	68 195 264,10	7 735,90	
7117	Pobřežní	94	0,0	2 797,0	2 796 635,70	364,30	
	Pobřežní	88	7 000,0	7 334,0	7 334 000,00	0,00	
7121	Háštalské náměstí	94	0,0	44,3	44 268,00	32,00	
7125	Hlávkův most	94	9 980,0	1 000,0	1 000 000,00	0,00	
7296	Štefánikův most	94	0,0	1 277,7	1 277 700,40	-0,40	
7334	Šaibova	88	26 700,0	13 700,0	13 699 729,90	270,10	
7338	nábř. E. Beneše	94	70 000,0	44 000,0	43 989 845,07	10 154,93	
7559	Alšovo nábřeží	94	21 000,0	18 012,3	18 012 270,04	29,96	
7560	Chodníkový program	94	10 000,0	41 191,9	41 191 935,08	-35,08	
7561	Chotková	94	0,0	16 757,0	16 756 652,00	348,00	
7562	Janáčkovo nábřeží	94	18 950,0	18 950,0	18 949 999,80	0,20	
7563	Moskevská Bohdalec	94	53 894,0	75 330,0	75 328 870,70	1 129,30	
					350 027 130,82		

Číslo akce	Název akce	Účel. znak	SR 2005		UR 2005		Skutečnost		Rozdíl v Kč	Poznámka
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	k 31.12.2005			
7564	Na Maninách	94	25 000,0		43 784,7		37 888 292,80		5 896 407,20	X
7565	Pobřežní III.	94	43 000,0		10 667,0		10 666 763,20		236,80	
7567	Vyskočilova,5,května náj.rampa	94	0,0		116,2		116 200,00		0,00	
7568	Za Elektrárnou	94	32 517,0		35 987,0		35 979 809,07		7 190,93	X
7785	Pomořanská park.stáni	94	1 000,0		1 311,6		1 076 082,00		235 518,00	X
7876	SSZ ČeskobrodskáxMl.Běchovic	94	3 500,0		2 073,0		572 577,00		1 500 423,00	X
4346	Cyklostezky	94	27 800,0		18 097,0		18 097 851,36		-851,36	
8001	Sokolovská,Balabenka,Na Břehu	94	40 000,0		114 034,0		114 034 810,07		-810,07	
8005	Petrská	94	0,0		19 230,1		19 230 100,00		0,00	
8105	U Libeňského pivovaru	94	0,0		19,0		19 040,00		-40,00	
8110	Malešická	94	0,0		340,0		340 002,00		-2,00	
8111	Pražská Švehlova	94	0,0		160,5		160 494,00		6,00	
8113	Branická,odst.parkoviště	94	0,0		119,0		118 107,00		893,00	
8500	Rek.zábradlí Barrandovského mostu	94	0,0		568,5		568 434,60		65,40	
	Rek.zábradlí Barrandovského mostu	91628	0,0		44 510,0		35 004 403,89		9 505 596,11	
8534	Autobus.zastávka Hlubočepy	94	0,0		300,0		300 000,00		0,00	
8514	Dodávka a instalace označníků TAXI	94	0,0		1 732,0		1 731 932,00		68,00	
8565	Rek.Liberecká a Čínovecká	91628	0,0		30 000,0		29 999 988,30		11,70	
4853	Kolbenova Kbelská	94	0,0		56,0		55 977,60		22,50	
8106	Vltavská	94	0,0		35,7		35 700,00		0,00	
8108	U Sluncové	94	0,0		222,8		222 771,20		28,80	
							306 219 336,09			

Číslo akce	Název akce	Účel. znak	SR 2005 v tis. Kč	UR 2005 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2005 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
3208	most Žličín, Řevnická	94	0,0	447,0	447 000,00	0,00	
8604	Záhřebská	94	0,0	5 186,4	5 186 369,90	30,10	
8605	Liberecká úsek Kbelská-Vysočanská do centra	91628	0,0	11 000,0	9 887 479,40	1 112 520,60	
8606	Liberecká úsek Davidková-rampa Levinská	94	0,0	262,0	261 562,00	438,00	
	Liberecká úsek Davidková-rampa Levinská	91628	0,0	34 444,0	26 667 535,30	7 776 464,70	
8607	Rozvadovská spojka/Řevnická hran.Prahy	91628	0,0	34 750,0	31 272 033,69	3 477 966,31	
8053	SSZ Průmyslová Teplárenská	94	5 000,0	5 988,0	5 987 763,90	236,10	
celkem					79 709 744,19		
Zpracoval/a/	Nepevná	Dne:	17.1.2005	Podpis ředitele:	ing. L.Dostál		
Telefon:	257015530	Razítka					

HMP	94	844681,2	828 916 000,59
HMP	88	32904	32 903 729,00
SFDI	91628	622280	540 125 811,28
celkem		1499865,2	1 401 945 540,87

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ PROVOZNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CHOD. PROGRAMU MČ PRAHA 6 - ROK 2005

Podklad pro vrácení nedočerpáných fin.prostředků převedených na TSK zpět do rozpočtu MČ Praha 6.

č. akce	název	přiděleno - plán		čerpání 2005	nedočerpáno z příspěvku MČ
		MČ praha 6	TSK HMP		
710/1	Falká, Malobřev.	537 000,00	-	537 000,00	531 651,60
710/2	Na ofechovce	580 000,00	-	580 000,00	579 589,50
710/3	Kněževeská	595 000,00	-	595 000,00	589 640,30
710/5	Českomalínská	340 000,00	-	340 000,00	339 572,00
710/6	Dobrovízská	1 092 738,00	-	1 092 738,00	1 090 788,50
710/7	Dejvicecká	490 000,00	-	490 000,00	485 006,00
710/8	Čs Armády	6 500 000,00	-	6 500 000,00	6 368 450,70
710,9	Vítězné nám.	500 000,00	-	500 000,00	467 362,98
710/10	Někrasova	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 299 992,70
710/11	Zemědělská	593 000,00	-	593 000,00	589 285,70
710/12	Nad Šárkou	2 370 000,00	-	2 370 000,00	2 285 501,00
710/13	Pisecká brána	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 012 062,70
CELKEM		18 097 738,00		18 097 738,00	17 638 903,68
					458 834,32

M. L. Lao & Ru

výhodověna stanoviska.

Poznámka: rozdíl mezi počtem přijatých podání k výřízení a počtem odeslaných kalendářní rok, ale havane tm, že „vystromovaná“ podání nesou evidována jako odeslaná výřízených výjádření je způsoben jedná tm, že nektére připadly přechazejí přes

měsíc	přijato	k výřízení	odeslano	poznámka
leden	251	239	- 12	
únor	213	210	- 3	
březen	243	226	- 17	
duben	230	234	+ 4	
květen	242	225	- 17	
červen	223	233	+ 10	
červenec	204	183	- 21	
srpen	210	226	+ 16	
září	192	198	+ 6	
říjen	182	189	+ 7	
listopad	209	215	+ 6	
prosinec	212	179	- 33	
celkem rok	2.611	2.557	- 54	

ZA ROK 2005

SOUHRNNÝ PŘEHLED O POČTECH VYJÁDŘENÍ SVODNÉ KOMISE TSK

Tato činnost, včetně věskere evidence, sledování oběhu podání, kompletece s kooridinacím výjádření, rozmnázování, rozsestlaní, parování se stanoviský OSM - MHMP a archivace, byla zajištována 3-mi pracovníky oddoru, v objemu uvedeném v následujícím přehledu :

Kromě toho zpracovávala také souhrnná technická stanoviska za organizaci k předkládaným projektovým dokumentacím cizích investorů v rozsahu studií a u výbřaňých stavby s velkým počtem komunikací a komunikací objektu přebíraných do správy nekterých komplikovaných akcí i k reálizační projektove dokumentací staveb (většinou nekompletní komunikace akcí i k reálizační projektove dokumentací staveb) . TSK různymi tvaru organizace).

Svoudrá komise TSK, v průběhu roku 2005, výpracovala a vydávala souhrnná technická stanoviska za organizaci k akcím cizích investorů, která slouží jako podklad pro stanoviska vlastníka (HMP), vydávaná OSM - MHMP a to k projektove dokumentaci v rozsahu pro územní rízení a stavění povolení.

Závěrem lze konstatovat, že největším problémem pro následující období bude vzhledem ke značnému nárůstu rozsahu nové budováníych komunikací a objektů cizími investory, stanovený funkčního systému ježich přebíráni do správy TSK, včetně jednotného názoru na rozsah přebíraných komunikací.

Z odborného technického pohledu bude nutné do budoucna stanovit jednotný průtah za organizaci k nekterým typickým činnostem a technickým problemům vyškýřujícím se v jednotlivých akcích a sítendotírak různorodé pozadavky jednotlivých útvary do standardního pozadavku za TSK (podmíky pro možnost následní nového povrchu komunikací, pozadavky na firmy provádějící zpráve upravy povrchů, délka záruky ihdy, délka následného pěce o záležitosti investorem před předáním TSK, atd.).

Z hlediska organizací a bezpečnosti chodu Svođe komise, byly problemem možnictví se počty neúplných nebo nedostatečných podání od investorů, která zvyšuje skoky u plánů jednotných v rámci intermího obchodu, které negativně ovlivňovaly finanční časové nároky na fond pracovní doby sponzeny s admisistrativou jednotlivých akcí a terminy vydání souhrnného technického stanoviska.

V 9-ti připadecb bylo nutné svolat Svođe komisi v „střítm“ plném složení, situace vyžadovala jednotný závěr a řešení. dle PP 01/99, neboť výjádření jednotlivých útvary TSK byla rozporuplná a neslučitelná a
